
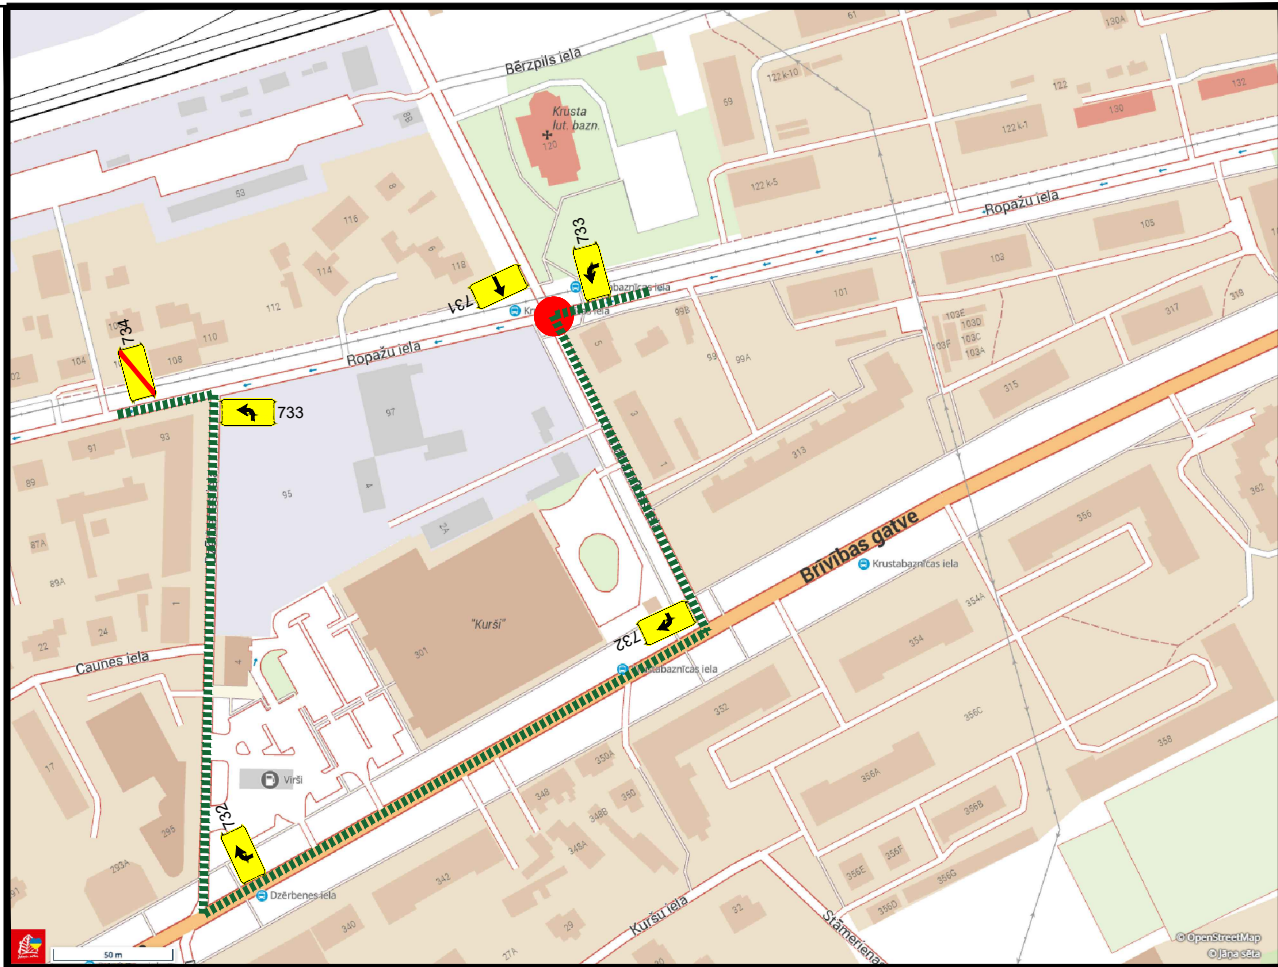
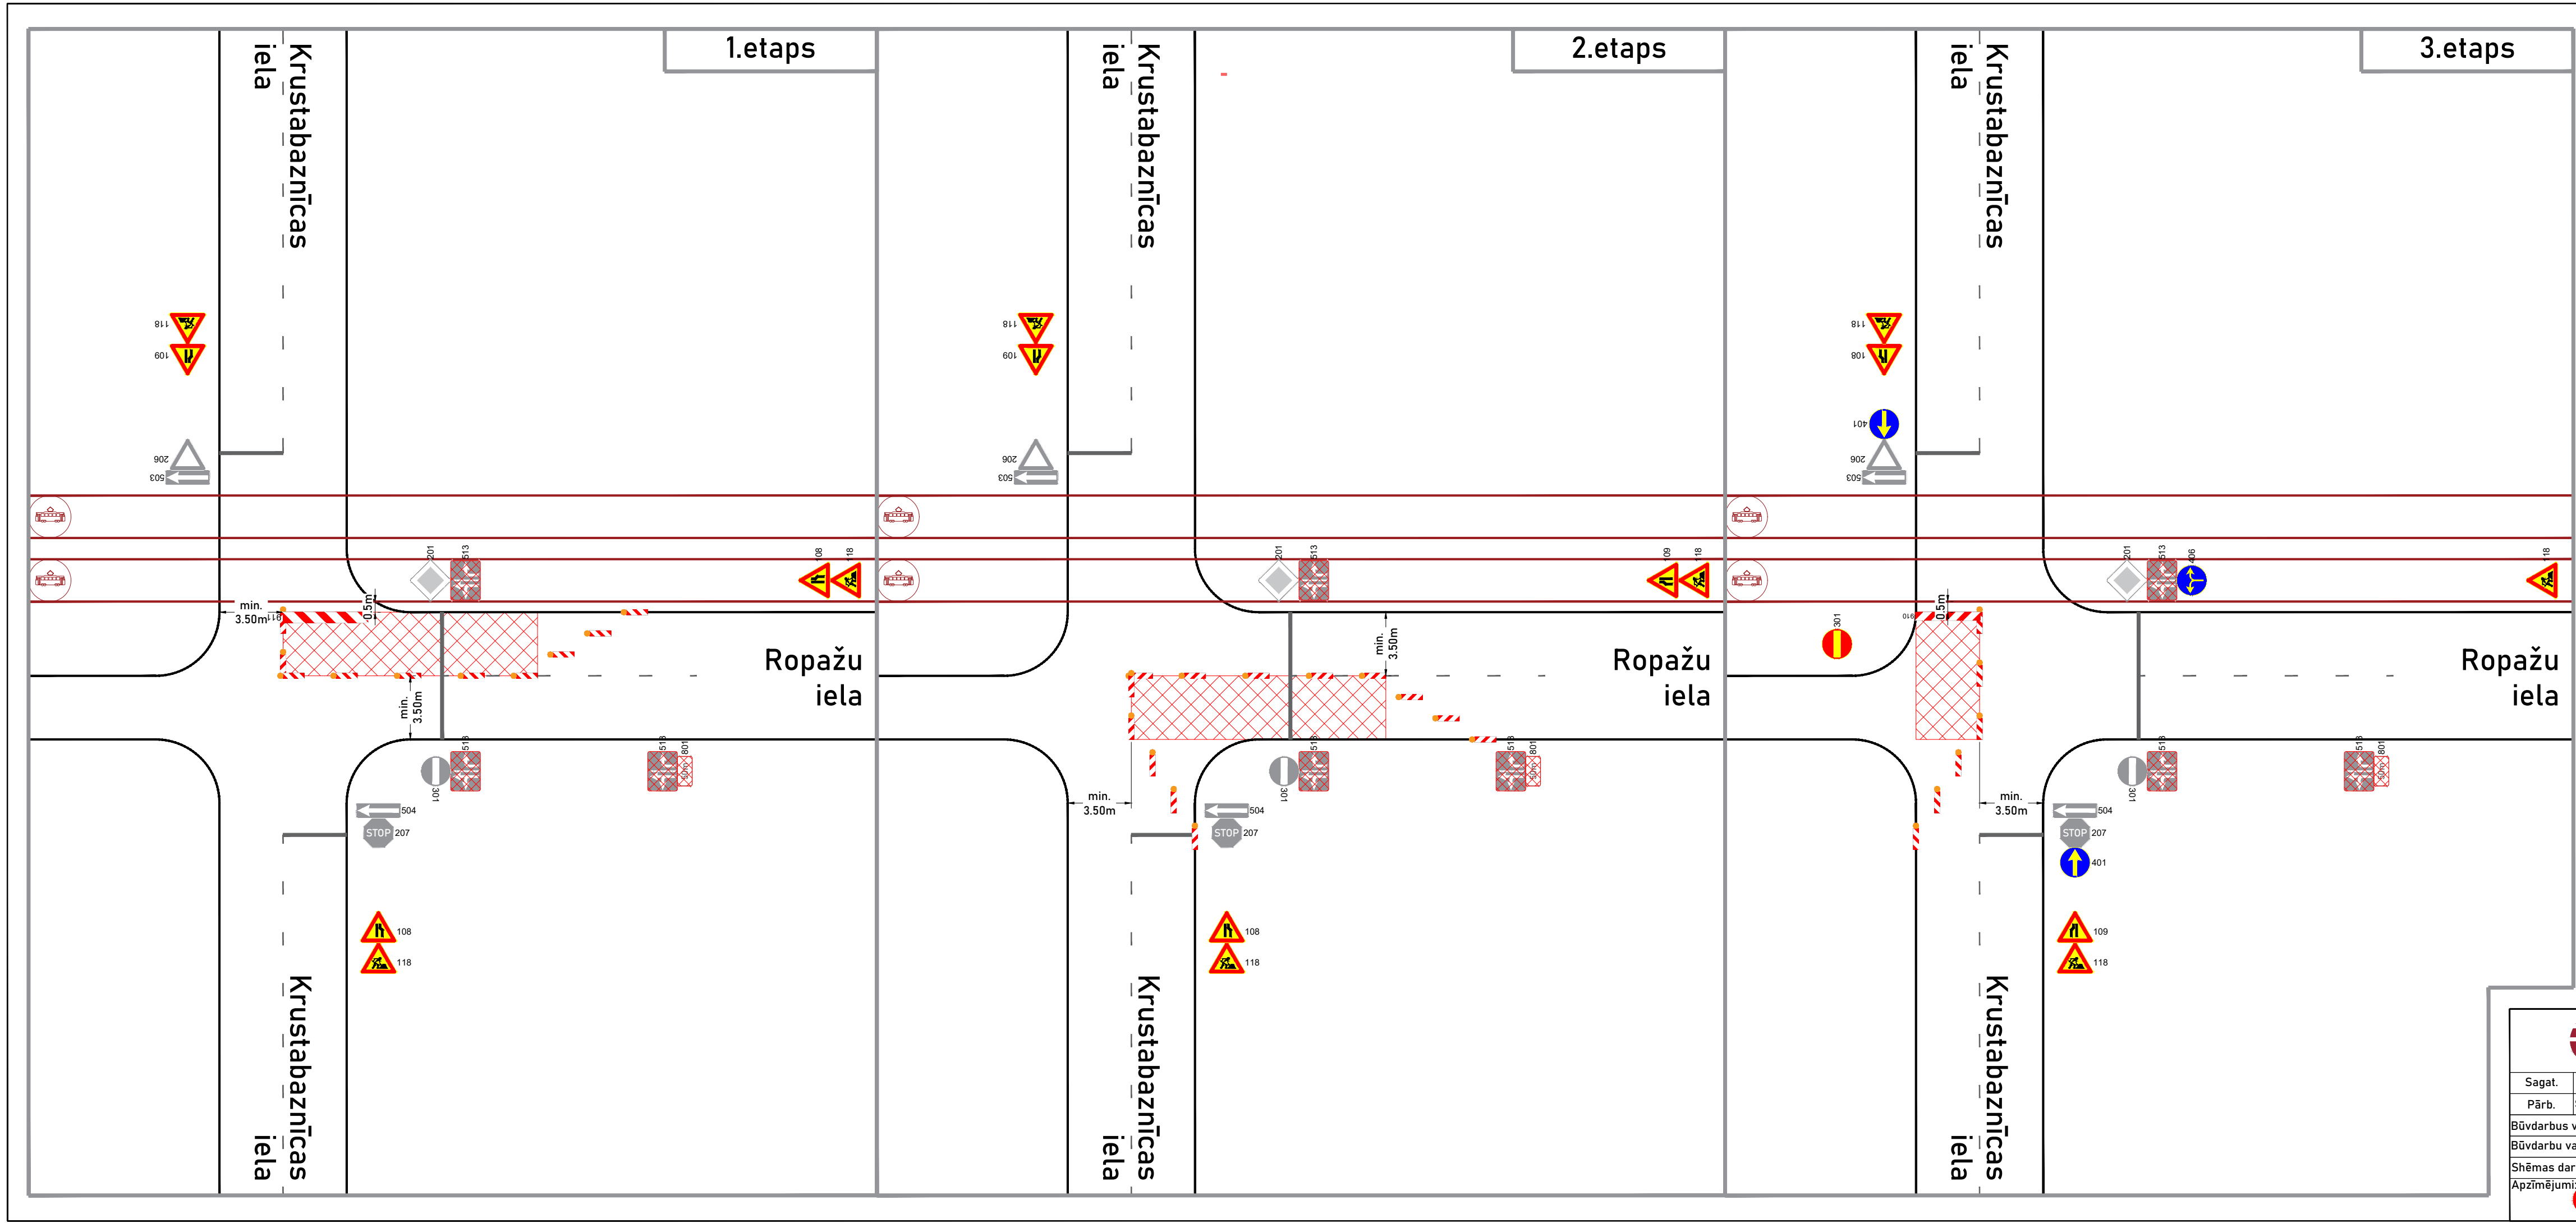




3.etapa apvedceļi

Saskaņots:
RP SIA "Rīgas satiksme"
ar nosacījumiem:
Diennakti pirms darbu uzsākšanas informēt vecāko Centrālinspektori pa tālruni: 80000008.
-Darbu veikšanu organizēt, neslēdzot un neaizņemot sabiedriskā transporta satiksmi.
-Nodrošināt drošu tramvaju kustību izmantojot kontakttīklu.
-Nodrošināt esošo elektrotransporta kontakttīkla uzturēšanas konstrukciju un saglabāšanu levērot elektrotransporta kontakttīkla konstrukciju aizsardzības zonu: 1,0m no kontaktvada un atsailes līnijas ass uz katru pusi.
-Nodrošināt vadstatņu izvietojumu min. 1 m attālumā no malējās tramvaja slīdes.
-Veicot būvdarbus tramvaju slīžu zonā (2,3m no tuvākā slīžu ceļa ass), paredzēt būvdarbus stiprināšanu, nodrošinot tramvaju slīžu klātnes saglabāšanu visā būvdarbu laikā.
-Būvdarbu laikā aizliegta konstrukciju stiprināšana pie RP SIA "Rīgas satiksme" atstātnēm.
-Dienā pirms darbu uzsākšanas izsaukt ceļu satiksmes pārstāvi pa tālruni: 29278517.
-Visā būvniecības laikā, nepieciešamības gadījumā, nekavējoties jānodrošina brīva piekļuve RP SIA "Rīgas satiksme" darbiniekiem un to rīcībtransportlīdzekļiem kontakttīkla konstrukciju profilaktisko un avārijas darbu veikšanai.
RP SIA "Rīgas Satiksme"
Mārtiņš Platinskais
parakstīts elektroniski
Vecākais inženierkomunikāciju
Piesaites inženieris
21.07.2026.

 Binders			Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietojuma shēma		
Objekts: Ceļa seguma atjaunošana pēc ūdensvada un kanalizācijas tīklu remonta darbiem.			Apraksts: 1.Darba vieta tiks aprīkota pēc M-K noteikumiem nr.421 "Noteikumi par darbu vietu aprīkošanu uz ceļiem". 2.Pagaidu ceļazīmes tiek uzstādītas ievierojot LVS 77-2 uzstādīšanas noteikumus. 3.Satiksmes organizācijas shēma paredzēta: Seguma atjaunošana pēc tīklu remontdarbiem. 4.Skēršņnorobežojums - Barjera, vai vienvirspusīe vadstatņi maks. 2m attālumā cits no cita, stipulums 1:2 pret brauktnes malu. 5.Garennorobežojums - divpusīgie vadstatņi maks. 10m attālumā cits no cita. 6.Darbus plānots veikt tikai naktīs laikā.		
Sat.org.inženieris	I.Gailiņš	14.07.2026			
Sat.org.darbu vad.	M.Blušs				
veic:		Ceļu būves firma SIA "Binders"			
dīdņājs:		Ainārs Karlsons Tel: 29 394 674			
būvības laiks atbilstoši kalendārajam grafikam		Atbildīgais par darbu vietas aprīkojumu: CBF SIA "BINDERS" Sat.org. darbu vadītājs M.Blušs tel: 29480114 e-pasts: martins.bluss@binders.lv			
		Darbu zona		Gājēju zona	Gājēju barjera
				Pagaidu horizontālie apzīmējumi	Ropažu - Krustabaznīcas
