

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta direktora p.i. rīkojumam
"Par satiksmi Gaigalas ielā, Silikātu ielā, Keramikas ielā un Tekstilnieku ielā"

Pielikums

Luksoforu signālpāns posma garumam 200m


Virziens	Distance	t-zaļš	t-dzelt.	t-sark.	
V1	200m	108s	4s	204s	
V2	200m	108s	4s	204s	

* nepieciešamības gadījumā, luksofora signālpānu korigēt atbilstoši faktiskajai satiksmes intensitātei!!!

- Transporta plūsmas virziens V1
- Transporta plūsmas virziens V2

B731_B
A733_A

- Apbraukšanas ceļa virzieni

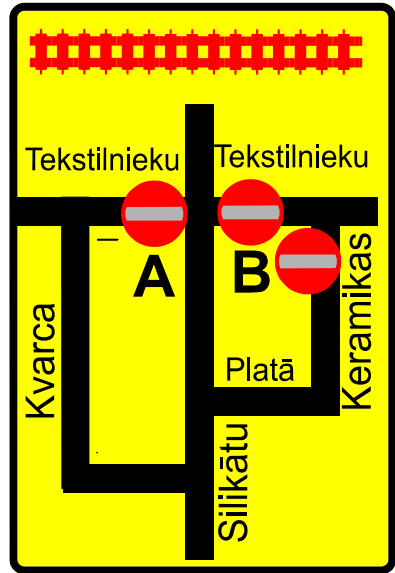

- Apbraukšanas ceļa shēma

GĀJĒJU CEĻA GARUMI:

- 440m
- 650m
- 320 m



- Būvniecības brīdinājuma plakāts

8 -05- 2025

Nosacījumi:
- Darba vietu aprīkot atbilstoši LVS 77-2 un MK noteikumiem Nr.421
- Satiksmes organizēšanas izmaiņas pēc darba laika beigām vai brīvdienās, kā arī citos gadījumos nav paredzētas.
- Nodrošināt vietējo un operatīvo satiksmi.
- Darbu veicējam jāveic pasākumi gājēju drošībai un vides pieejamībai darbu zonā.
- Darbu veicējam ir tiesības regulēt satiksmi darbu veikšanas laikā, ja rodas neparedzēti apstākļi, kurus ar darba vietas aprīkojuma shēma esošajiem tehnikājiem līdzekļiem nav iespējams nekavējoties novērst (MK not. Nr.421 punkts 20)
- Nodrošināt minimālo joslas platumu 3,25m
- Nodrošināt minimālo gājēju ceļa brīvleju 1,50m
- Norobežojošās barjeras darbu veicējs uzstāda, ja nepieciešams norobežot ietvi no darba vietas, kas ierīkota uz brauktuves, (MK not. Nr. 421 punkts 79.1.3), Starp uzstādītajām barjerām drīkst novietot signāllentes, attālumam starp lentes stiprinājumiem nepārsniedzot 4,0m.(MK not. Nr. 421 punkts 70.3)
- Shēmas darbības laiks atbilstoši kalendārājam grafikum.
- Segas pārbūve, ceļa segas konstrukcijas izbūve, komunikāciju izbūve, labiekārtošana
Darbus veic SIA ACBR, atbildīgais darbu vadītājs - Dāvis Serdāns
atbildīgais par satiksmes organizāciju Vladimirs Popovs (tel. 26352405)

- Gājēju kustība būvdarbu laikā
- Paliģbarjeras
- Satiksmi slēgtā darbu zona
- Pagaidu ceļa izbūve
- Esošās ceļa zīmes vieta un numurs
- Uzstādāmās ceļa zīmes vieta un numurs
- Aizskājamās vai demontējamās ceļa zīmes vieta un numurs
- Esošie ceļu horizontālie apzīmējumi

SĪMĒNAS Nr.7A		IZPĒRĒTĀJS			PASŪTĪTĀJS	
Lapa 1/1		Ziepniekkalna iela 21a, Rīga, LV-1004 Tālrunis: 67627782 E-pasts: info@acbr.lv			Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Publiskās infrastruktūras attīstības pārvalde Kungu iela 3, LV-1050, Rīga	
Projekta vadītājs		Uzvārds	Paraksts	Datums	OBJEKTS: Pilsētas sabiedriskā transporta un infraštruktūras savienojums ar dzelzceļa staciju Bolderāja	
Izstrādāja		D.Serdāns				
Saskaņoja		E.Andersons				
Saskaņoja					Satiksmes organizācija būvdarbu laikā	
BIS lietas nr.		BIS-BL-771051-105880				

Virziens	Distance	t-zaļš	t-dzelt.	t-sark.	
V1	200m	108s	4s	204s	
V2	200m	108s	4s	204s	


* nepieciešamības gadījumā, luksofora signālpānu koriģēt atbilstoši faktiskajai satiksmes intensitātei!!!

- Transporta plūsmas virziens V1

- Transporta plūsmas virziens V2

B731_B
A733_A

- Apbraukšanas ceļa virzieni

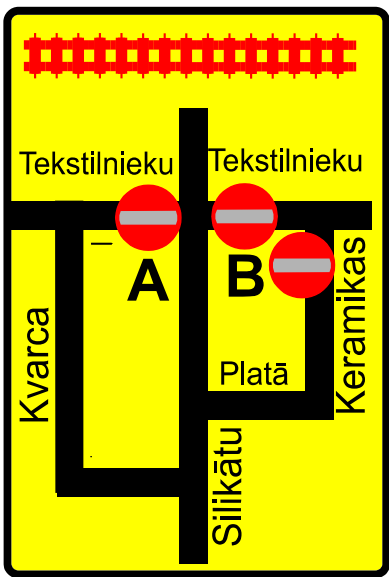

730_1

- Apbraukšanas ceļa shēma

Saskaņots:
RP SIA "Rīgas satiksme"
ar nosacījumiem:
Diennakti pirms darbu uzsākšanas informēt vecāko Centrāldispečeri pa tālr.: 80000008;
Darbu veikšanu organizēt, neslēdzot sabiedriskā transporta satiksmi un netraucējot sabiedriskajam transportam, nodrošināt vismaz 3,5 m platu braukšanas joslu un pagriezienu rādīsu sabiedriskajam transportam;
-veicot darbus pieturvietu zonā, paredzēt sabiedriskā transporta pieturvietu pārcelšanu;
- 2 darbu dienas pirms pieturvietas pārcelšanas informēt RP SIA Rīgas satiksme" pārstāvi pa tālr. 26336602;
-3 stundas pirms pamatpieturvietas atklāšanas informēt vecāko centrāldispečeri pa tālr.: 80000008 un RP SIA Rīgas satiksme" pārstāvi pa tālr. 26336602;
-uz darbu veikšanas laiku aizklāt esošo pieturvietas zīmi;
-esošajās pieturvietās izvietot informāciju par pieturvietas pārcelšanu (virziens, attālums);
-pagaidu pieturvietās izvietot pagaidu kustības sarakstus;
Pieturvietas platformas minimālais garums 20 m., nodrošināt piekļauvi RP SIA "Rīgas satiksme"
Paraksts elektroniski
Mārtiņš Plataiskals
vecākais inženierkomunikāciju
Piesaistes inženieris
09.05.2025

GĀJĒJU CEĻA GARUMI:

- 440m

- 650m

- 320 m

UZMANĪBU!
UZ CEĻA STRĀDĀ
DARBUS VEIC SIA "ACBR"
Rīga, Ziepiņkalna iela Nr. 21-a LV-1004
Atbildīgais būvdarbu vadītājs:
Dāvis Serdāns tel. +371 67627782

- Būvniecības brīdinājuma plakāts

Tehniskā nolietne būvdarbu laikā

- Gājēju kustība būvdarbu laikā

- Paliģbarjeras

- Satiksmi slēgtā darbu zona

- Pagaidu ceļa izbūve

▼206

- Esošās ceļa zīmes vieta un numurs

▲118

- Uzsātdāmās ceļa zīmes vieta un numurs

326

- Aizskāšanās vai demontējamās ceļa zīmes vieta un numurs

- Esošie ceļu horizontālie apzīmējumi

Nosacījumi:
- Darba vietu aprīkot atbilstoši LVS 77-2 un MK noteikumiem Nr.421
- Satiksmes organizēšanas izmaiņas pēc darba laika beigām vai brīvdienās, kā arī citos gadījumos nav paredzētas.
- Nodrošināt vietējo un operatīvo satiksmi.
- Darbu veicošajam jāveic pasākumi gājēju drošībai un vides pieejamībai darbu zonā.
- Darbu veicošajam ir tiesības regulēt satiksmi darbu veikšanas laikā, ja rodas neparedzēti apstākļi, kurus ar darba vietas aprīkojuma shēma esošajiem tehniskajiem līdzekļiem nav iespējams nekavējoties novērst (MK not. Nr.421 punkts 20)
- Nodrošināt minimālo joslas platumu 3,25m
- Nodrošināt minimālo gājēju ceļa brīvēlpu 1,50m
- Norobežojošās barjeras darbu veikšanai uzstāda, ja nepieciešams norobežot ietvi no darba vietas, kas ierīkota uz brauktuves. (MK not. Nr. 421 punkts 79.1.3).
- Starp uzstādītajām barjerām drīkst novietot signāllentes, attālumam starp lentes stiprinājumiem nepārsniedzot 4,0m.(MK not. Nr. 421 punkts 70.3)
- Shēmas darbības laiks atbilstoši kalendārājam grafikam.
- Segas pārībve, ceļa segas konstrukcijas izbūve, komunikāciju izbūve, labiekārtošana
Darbus veic SIA ACBR, atbildīgais darbu vadītājs - Dāvis Serdāns
atbildīgais par satiksmes organizāciju Vladimirs Popovs (tel. 26352405)

OBJEKTAĻĀS		PASŪTĪTĀJS	
Shēmas Nr.7A Lapa 1/1	Ziepiņkalna iela 21a, Rīga, LV-1004 Tālrunis: 67627782 E-pasts: info@acbr.lv	Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Publiskās infrastruktūras attīstības pārvalde Kungu iela 3, LV-1050, Rīga	
Projekta vadītājs	Uzvārds D.Serdāns	Paraksts	Datums
Izstrādāja	E.Āndersons		
Saskaņoja			
Saskaņoja			
BIS lietas nr.	BIS-BL-771051-105880	OBJEKTA: Pilsētas sabiedriskā transporta un infrastruktūras savienojums ar dzelzceļa staciju Bolderāja	
		PASĒJUMS: Satiksmes organizācija būvdarbu laikā	
