


Pielikums
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārējpas un mobilitātes departamenta direktora p. i. rīkojumam
"Par satiksmi Dzirnava ielas un Tērbatas ielas krustojumā"

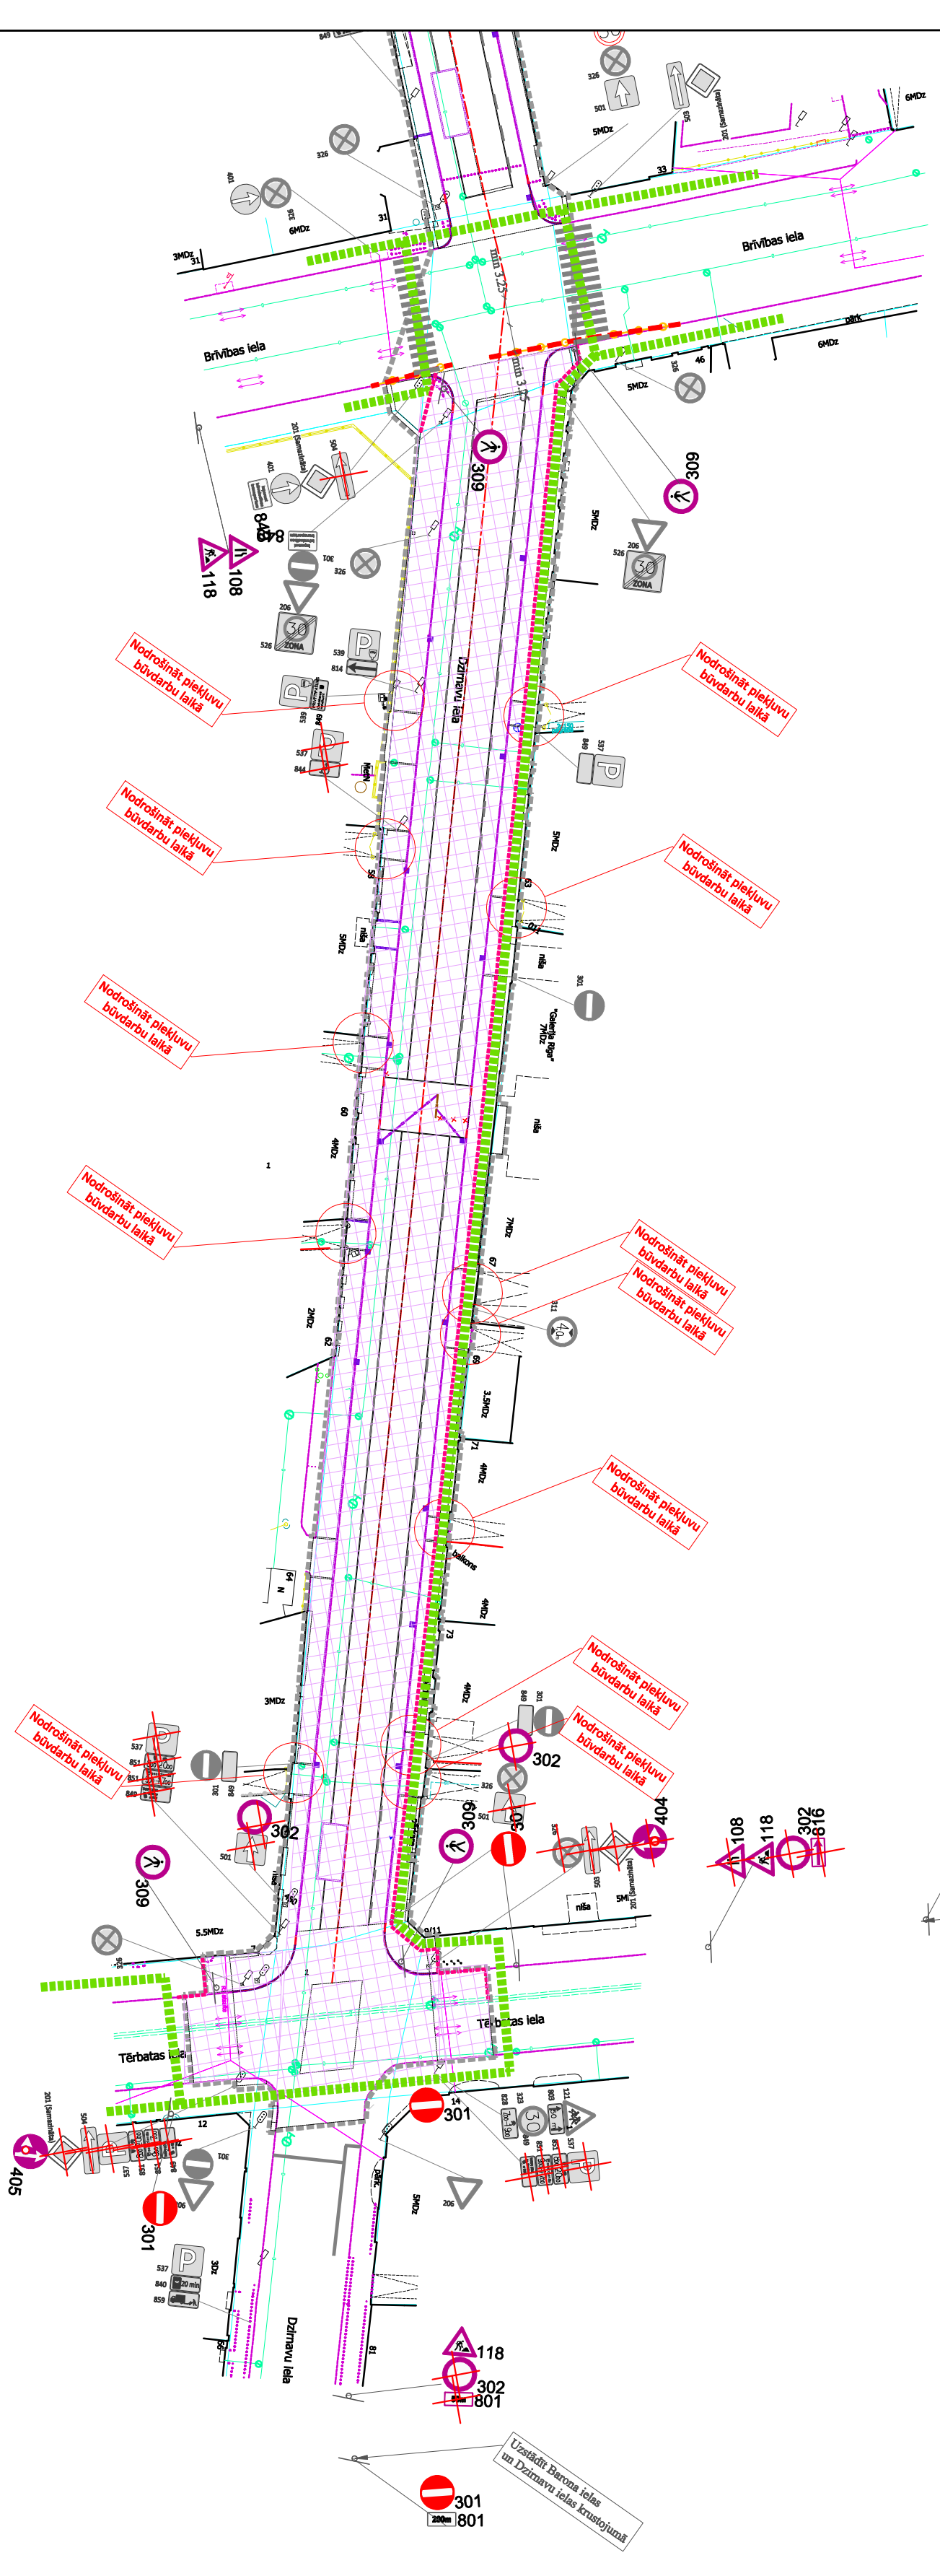


Darbus veikt līdz 25.08.2025.


Saskaņojuma atzīme ar Rīgas valstspilsētas Ārējpas un mobilitātes departamenta direktora rīkojumu
Sākuma ir Darbu veikšana
atbilstoši sadzīvotāju
Nē. 421

19-08-2025

Apbraucamā ceļa shēma

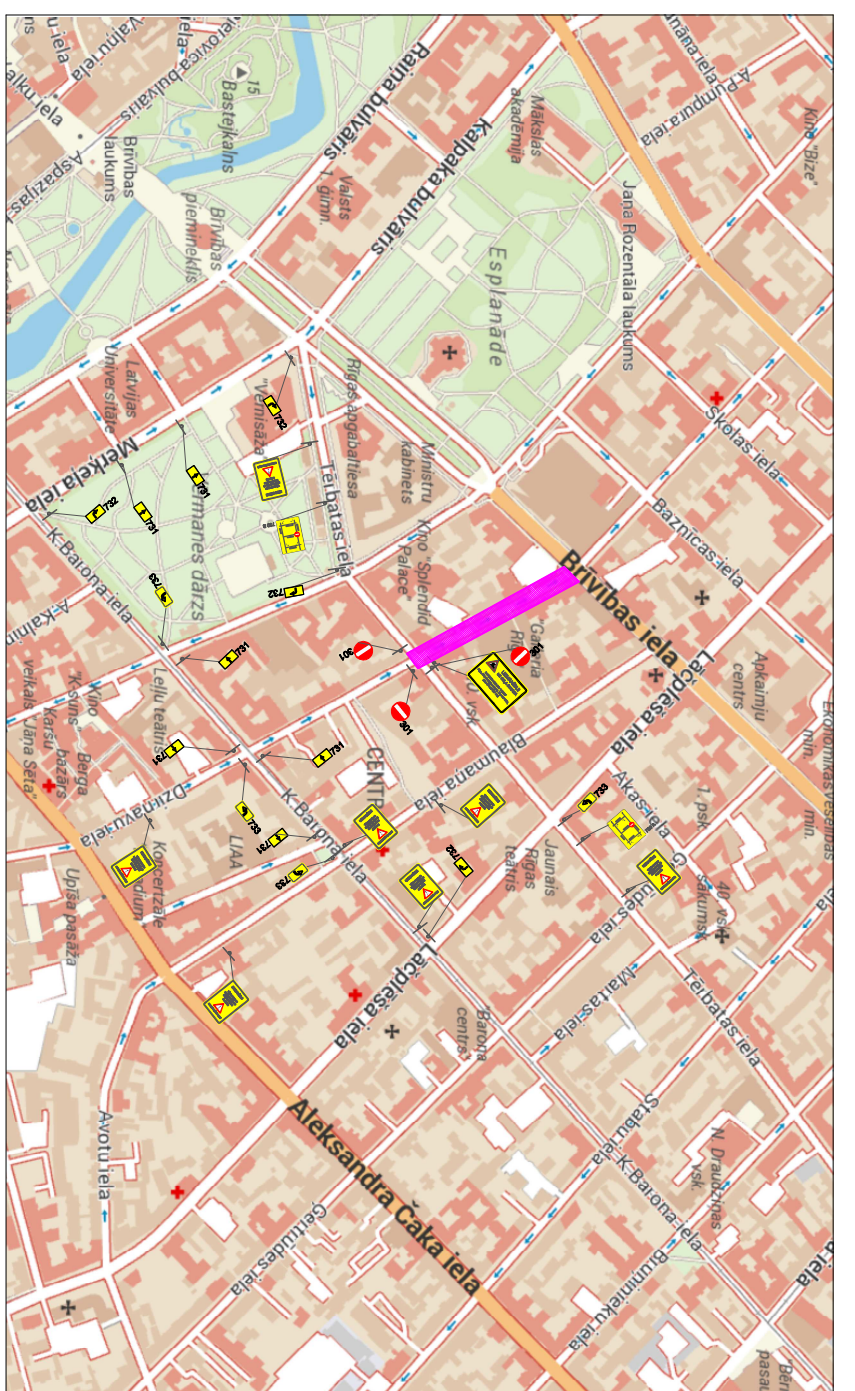

1. trolejbusa maršruta izmaiņas virzienā NO centra

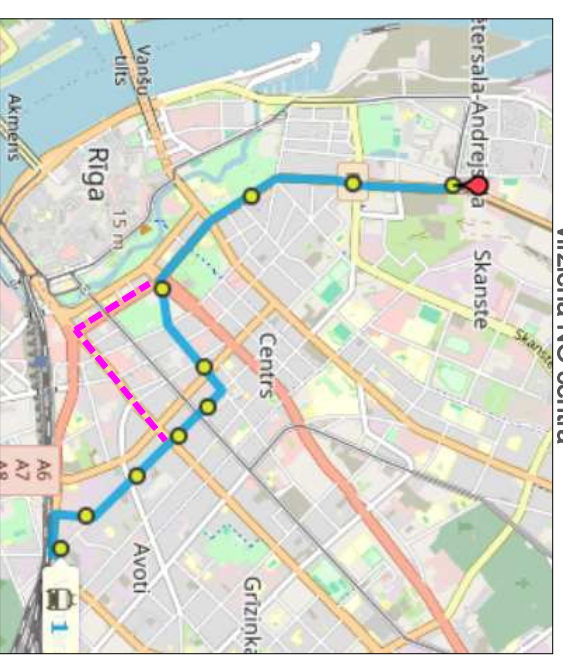

1. trolejbusa maršruta izmaiņas virzienā UZ centru

- APZĪMĒJUMI**
- Esosa ceļa zīme
 - Esosa atzīklājama ceļa zīme
 - Esosi ceļa horizontāli apzīmējumi
 - Uzstādāma remontdarbu ceļa zīme
 - Iepriekš uzstādāma remontdarbu ceļa zīme
 - Būvdarbu zona
 - Gājēju barjera
 - Vadītāju Pagaidu segums
 - Drošs gājēju ceļš

- NOSACĪJUMI**
- Darba vietu aprīkot atbilstoši LVS 77-2 un MK noteikumiem Nr.421
 - Nodrošināt vietējo un operatīvo satiksmi.
 - Darbu veicējiem jāveic pasākumi gājēju drošībai un vides pieejamībai darbu zonā.
 - Darbu veicējiem ir tiesības regulēt satiksmi darbu veikšanas laikā, ja rodas neparedzēti apstākļi, kurus ar darba vietas aprīkojuma shēma esošajiem tehniskajiem līdzekļiem nav iespējams nekavējoties novērst (MK not. Nr.421 punkts 20)
 - Nodrošināt minimālo joslas platumu transporta kustībai 3.25m
 - Nodrošināt gājēju ceļa brīvleju 1.50m
 - Nodrošināt gājēju piekļuvi namīpašumiem
 - Nodrošināt drošu piekļuvi sabiedriskā transporta pieturvietām
 - Norobežojošās barjeras darbu veicējs uzstāda, ja nepieciešams norobežot ietvi no darba vietas, kas ierīkota uz brauktuves. (MK not. Nr. 421 punkts 79.1.3). Starp uzstādītajām barjerām drīkst novietīt signāllentes, attālumiem starp lentas stiprinājumiem nepārsniedzot 4,0m.(MK not. Nr. 421 punkts 70.3)
 - Plānotais shēmas darbības laiks - saskaņā ar kalendāro būvdarbu grafiku
 - Darbus veic SIA "ACBR"
 - Atbildīgais par satiksmes drošību - Pēteris Jēgorovs

Shēmas darbības laikā Dzirnava ielas posmā no Tērbatas ielas līdz Brīvības ielai nodrošināt iedzīvotājiem piekļuvi, attālot iebraucāmu no Brīvības ielas puses.

Shēma Nr. 3	Lapa 1/1	IZPILDĪTĀJIS:	SIA "ACBR" Ziemeļiekārna iela 21a, Rīga, LV-1004 Tālrunis: 67627782 E-pasts: info@acbr.lv	PASŪTĪTĀJIS:	Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārējpas un mobilitātes departaments Gertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011 am@riga.lv
Būvdarbu vadītājs	P. Jēgorovs	Uzvārds		OBJEKTS:	Velojošas ierīkošana un ielu krustojumu labiekārtošana Dzirnava ielā no Tērbatas ielas līdz Skolas ielai
Izstrādāja	I.Mežale	Paraksts		RASEJUMS:	Satiksmes organizācijas shēma
Saskaņoja		Datums			Tērbatas un Dzirnava ielas krustojuma slēgšana
Pasūtītais					
