

Pielikums

Slēgtā posma apbraukšanas shēma



Saskanots

RP SIA "Rīgas satiksme" ar nosacījumiem:


- diennakti pirms darbu uzsākšanas informēt vecāko centrāldispečeri pa tālr.: 800000008;
- darbu veikšanu organizēt, neslēdzot sabiedriskā transporta satiksmi;
- veicot darbus pieturvietu zonā, paredzēt sabiedriskā transporta pieturvietu pārcelšanu;
- 2 darba dienas pirms pieturvietas pārcelšanas informēt RP SIA Rīgas satiksme¹ pārstāvi pa tālr. 26336602;
- 3 stundas pirms pamatpētījuma atklāšanas informēt vecāko centrāldispečeri pa tālr.: 800000008 un RP SIA Rīgas satiksme¹ pārstāvi pa tālr. 26336602;-pagaidu pieturvietas platformas garumu nodrošināt vismaz 35 m ar cieta segumu;
- iz 3 darba veikšanas laiku aizkārt esošo pieturvietas zīmi;
- esošajās pieturvietās izvietot informāciju par pieturvietas pārcelšanu (virzieni, atāllumus);
- pagaidu pieturvietās izvietot pagaidu kustības sarakstus;
- 3 darba dienas pirms rakšanas darbu uzsākšanas sapņemt atļauju darbu veikšanai RP SIA “Rīgas satiksme” elektrokabeļu aizsargosā, pieprasot saskanosana@rigassatiksme.lv;
- diennakti pirms darbu uzsākšanas RP SIA “Rīgas satiksme” elektrokabeļu aizsargosājā informēt RP SIA “Rīgas satiksme” pārstāvi;
- ievērot elektrottransporta kontaktkabeļu konstrukciju aizsardzības zonu;

0,5m no balsta pamata malas,
1,0m no kontaktvada un atsaites līnijas ass u.
usi;

- nēbartu ar nekait kontakttīkli balsta pamatus;
- nēbūtu laikā nodrošināt piekļuvi RP SIA "Rīgas satiksme" elektrotransporta kontaktīklu konstrukciju apkopei un remontam;
- būvdarēm, kas tuvāk pa 2,5m no balsta pamata paredzētā rīcienai vai analogu;
- darbiem, kas paredzēti tuvu RS balsta pamatiem, izsaukt ES pārstāvi 26631222;
- nodrošināt balstu aizsardzības pasākumus pret mehāniskiem bojājumiem;
- darbus sliežu ceļā joslā uzskatīt pēc rakstiskas rakšana atļaujas saņemšanas, RP SIA "Rīgas satiksme" Ceļu saimniecībā Brīvības ielā 189, tālr. 26814245 vai rainmonds.pagrodos@rigassatiksme.lv;
- saņemt rakšanas atļauju, iesniedz garantijas rakstu par sliežu ceļa pamatu un seguma atjaunošanu, kā arī vēlāku nosēdumu likvidēšanu;
- dienu pirms darbu uzsākšanas izsaukt ceļu saimniecības pārstāvi pa tālruni 29785817.

Elektroniski parakstīts

RP SIA "Rīgas satiksme"
Ģirts Manfelds
vecākais inženierkomunikāciju
piesaistes inženieris
11.11.2025

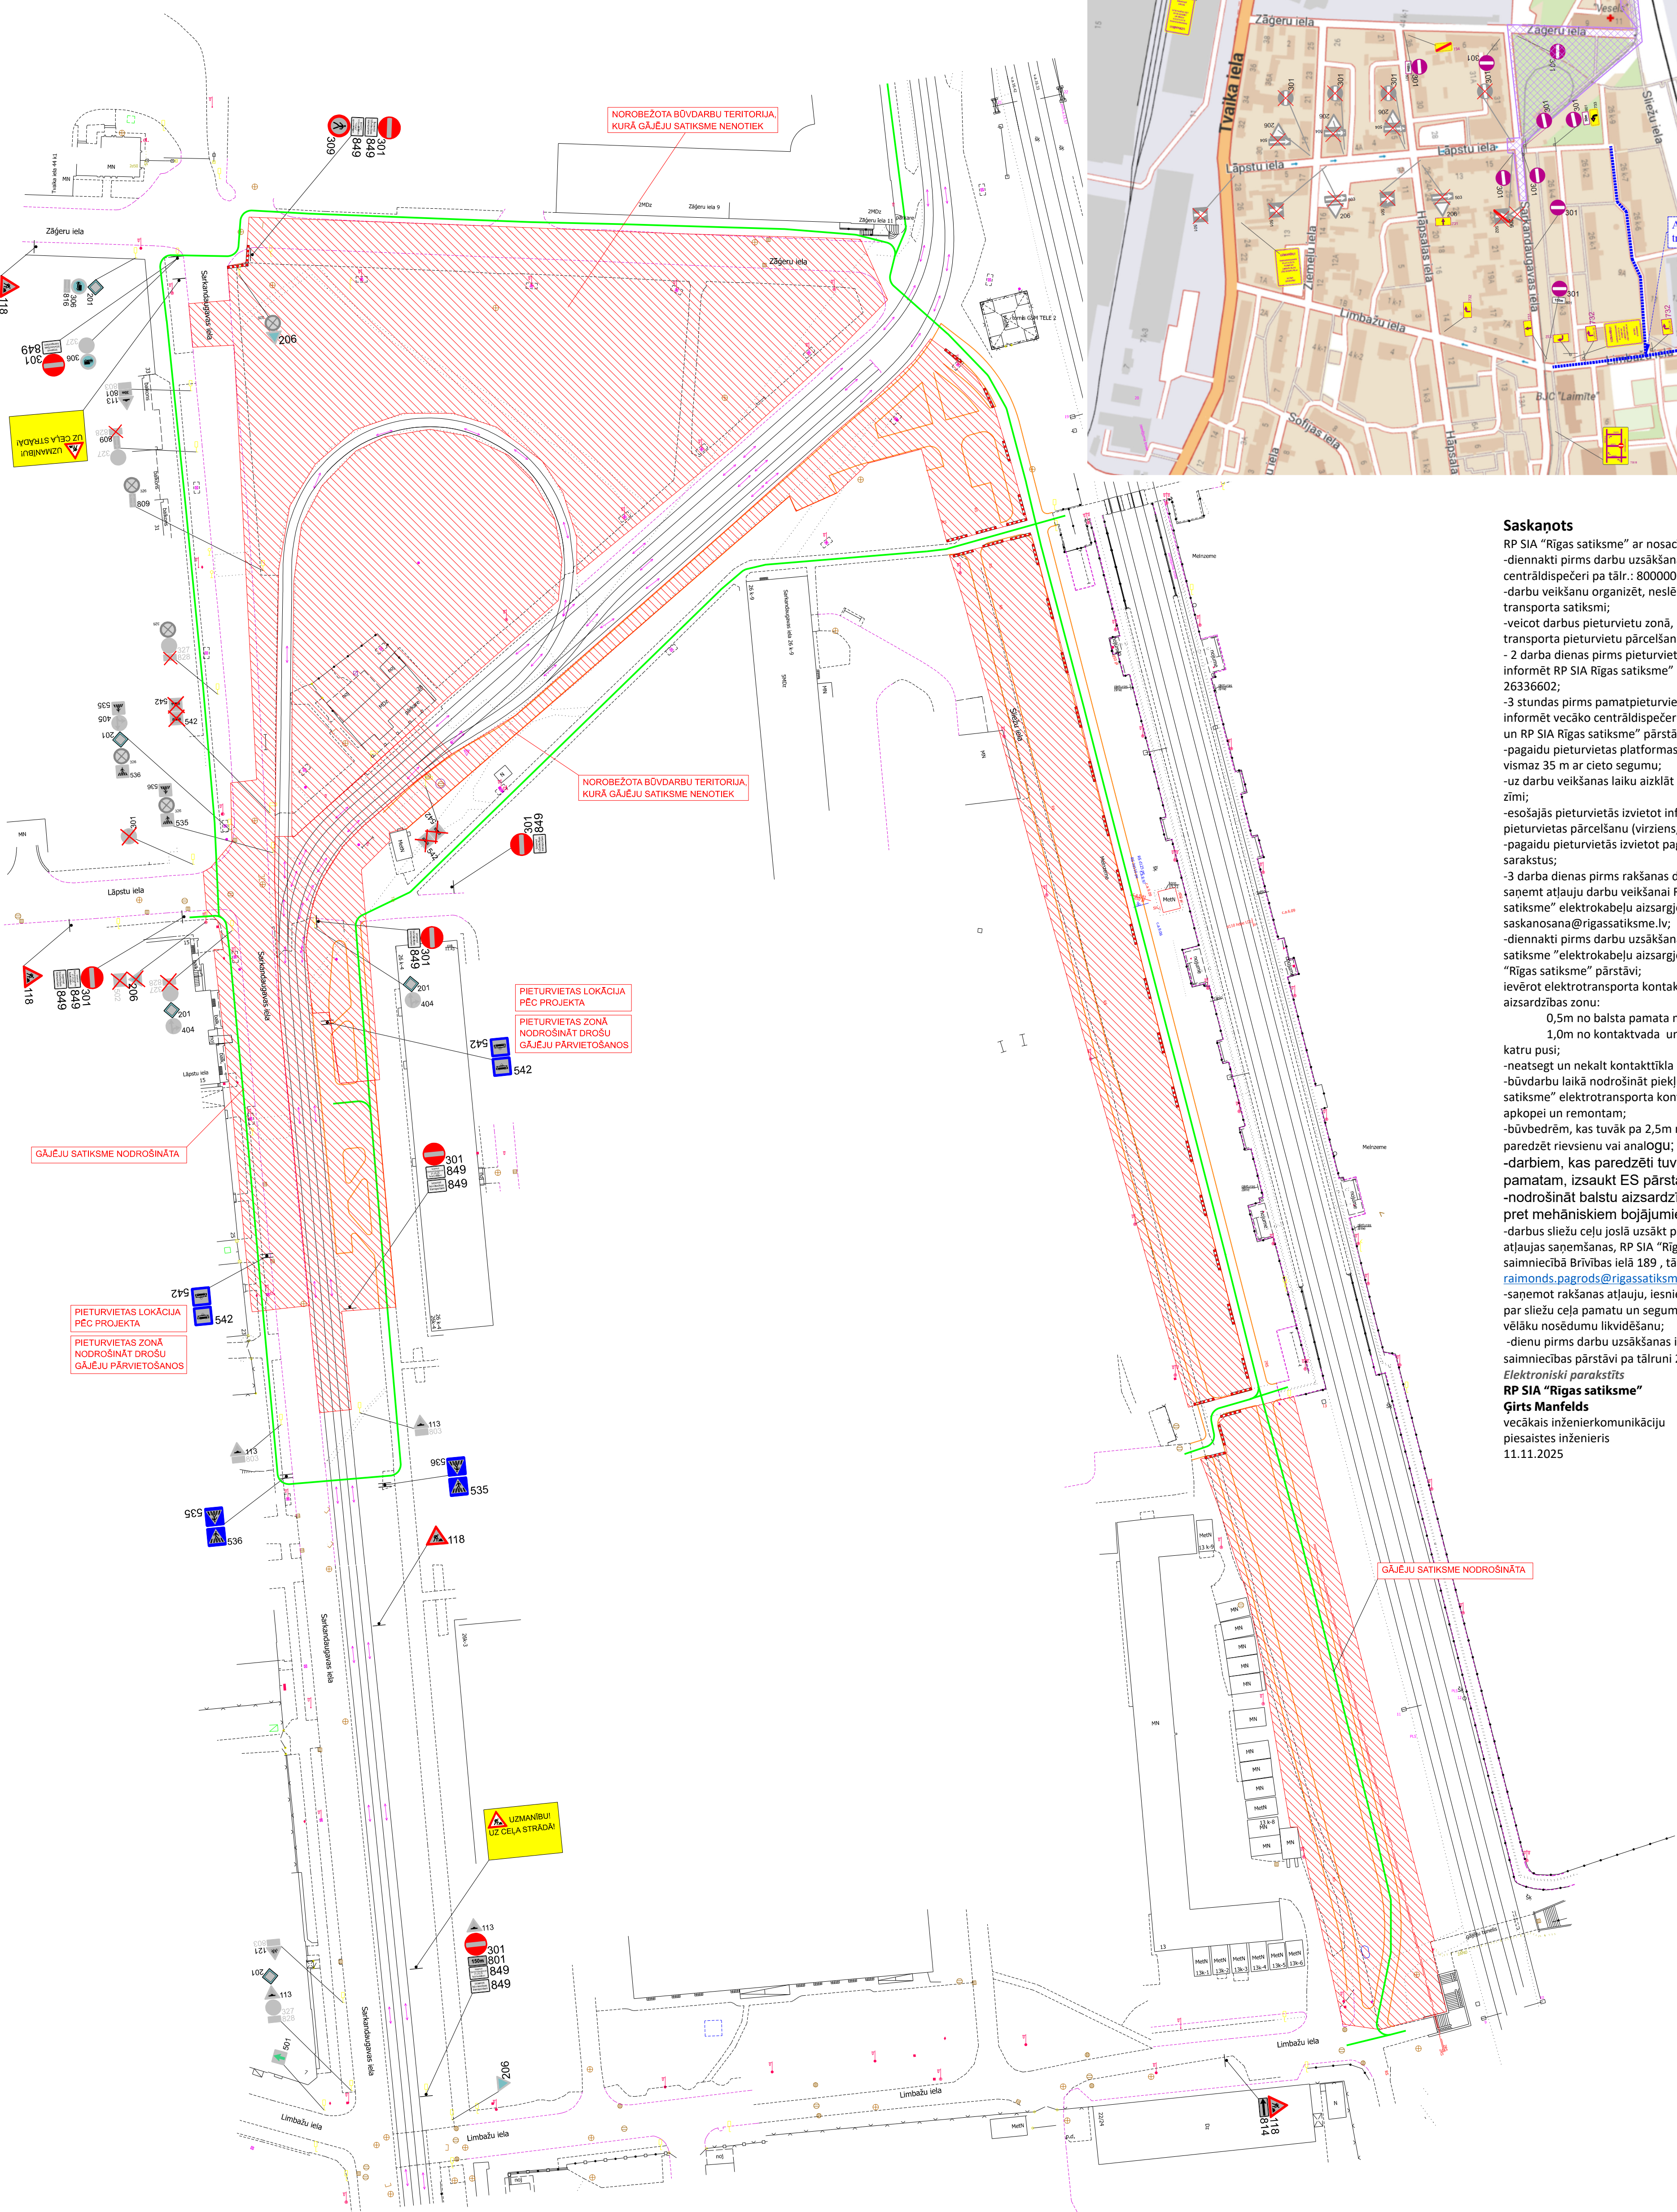

Shēma ir Darbu veikšanas
atļaujas neatņemama sastāvdaļa

10.11.2025

ZONA
CEĻĀZĪME
SAISEDZAMA CEĻĀZĪME
ĀMA CEĻĀZĪME
MARŠRUTS

NOSACĪJUMI:

- DARBU VIETU APRĪKOT ATBILSTOŠI LVS 77 UN MK NOTEIKUMIEM NR.421
- DARBU VEICĒJAM IR IETISĪBAS REGULĒT SATIKSMI DARBU VEIKŠANAS LAIKĀ,
- JA RODAS NEPAREDZĒTI APSTĀKĻI, KURUS AR DARBU VIETAS APRĪKOJUMA SHĒMĀ ESOŠAJIEM TEHNISKAJIEM LĪDZEKĻIEM NAV IESPĒJAMS NEKAVĒJOTIES NOVĒRST
- NODROŠINĀT MINIMĀLO JOSLAS PLATUMU SABIEDRISKĀ TRANSPORTA KUSTĪBAI 3.25m
- NODROŠINĀT GĀJĒJU CEĻA BRĪVTELPU 1.5m
- NODROŠINĀT PIEKĻUVI ĪPAŠUMIEM
- NODROŠINĀT DROŠU PIEKĻUVI SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PIETURVIETĀM
- NOROBEŽOJOŠĀS BARJERAS DARBU VEICĒS UZSTĀDA, JA NEPIECIEŠAMS NOROBEŽOT IETVI NO DARBU VIETAS, KAS IERĪKOTA UZ BRAUKTUVES. STARP UZSTĀDĪTĀJĀM BARJERĀM DRĪKST NOVILKT SIGNĀLENTS, ATTĀLUMAM STĀRPLENTS STIPRINĀJUMIEM NEPĀRSNIEDZOT 4.0m
- DARBUS VEIC SIA ACRB
- ATBILDĪGAIS PAR SATIKSMES DROŠĪBU - MĀRTIŅŠ CEPURNIEKS
- DARBU TERMIŅŠ - SASKANĀ AR BŪVDARBU GRAFIKU

SHĒMAS NR. 6. 2025	SATIKSMES ORGANIZĀCIJAS IZSTRĀDĀTĀJS:  SIA KMK PROJEKTS info@kmkprojekts.lv				PASŪTĪTĀJS:  SIA ACBR tel.: 67627782 info@acbr.lv
					OBJEKTS: PILSĒTAS SABIEDRISKĀ TRANSPORTA SAVIENOJUMA PUNKTA IZBŪVE DZELZČĒLA STACIJĀ DAUDERI
	RĀSĒJA	SIA KMK PROJEKTS	M.KRIŽEVICS		
	PĀRBAUDĪJA	SIA KMK PROJEKTS	R.KASNIKOVSĶIS		
					RĀSĒJUMS: DARBA VIETAS APRĪKOJUMA SHĒMA REMONTDARBU LAIKĀ
