



09.07.2026

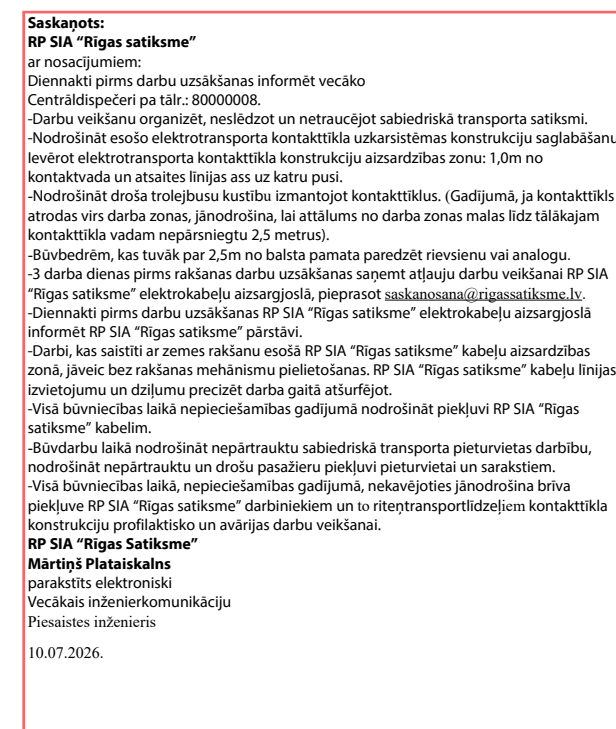

1. Ceļa zīmes atbilstošās LVS 77:2016 "Ceļa zīmes" un "Ceļa zīmes" apraksta un uzstādīšanas prasībām.
2. MK noteikumi Nr. 421 "Noteikumi par darbu vietu aprīkošanu uz ceļiem" prasībām.
3. Aprīkot būvdarbus ar norebozošām barjerām.
4. Nodrošināt iedzīvotāju un operatīvā transporta pietiekamu slēgta posma objektiem.
5. Darbu veicējs SIA "Rovlan Group" ierīko norebozošās barjeras un tas apkalpo, mainot ceļa darbu vietas robežas, nodrošinot aprīkojuma atbilstošu izvietojumu.
6. SIA "Rovlan Group" atbildīgais būvdarbu vadītājs - Kirils Pāpkovs, mob. tālr. 25444302.
7. Shēmas darbības laiks no _____ līdz _____.
8. Pēc būvdarbu pabeigšanas pagaidu ceļa aprīkojums tiek demontēts.
9. Darbus veic pa posmiem.
10. Nodrošināt pietiekamiu objektiem slēgtā posma zonā. Pirms darbu uzsākšanas informēt objektu īpašniekus par ielas posma slēgšanas grafiku un braukšanas apstāšanās vietām.
11. Norebozojošu barjeras Nr. 912 uzstādīt pirms satiksmes slēgtajiem ceļiem darbu posmiem.
12. Lietot vadstapstus Nr. 908/909 vai barjeras Nr. 910/911 darbu vietas norebošanai no brauktuves izmantot palīgbarjeras gājēju norebošanai no darbu zonas.

Shēma 2 (ūdensvada remonts ar sagraušanas metodi).

 SIA "Saava-LV", Alksos ieda 2-3, Rīga LV 1046 Vien.nos. Nr. 4001312768, PKN Nr. LV 4001313768 Tālrunis: 73122227, 7613330; fakss: 7311150 Elektroniskā reģistrācija Nr. 3620-B		Pasūtītājs SIA "Rovlan Group"			
		Objekts Aleksandra Grīna bulvāris, Rīga	Stadija TP	Marka GT	Lapas Nr 1
Sastādītāja S.Kazarovs tālrunis: 26495379 e-pasts: senjeps.kazarovs@gmail.com	17.06.2026 Ceļu satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu uzstādīšanas shēma Mērogs: bez mēroga				

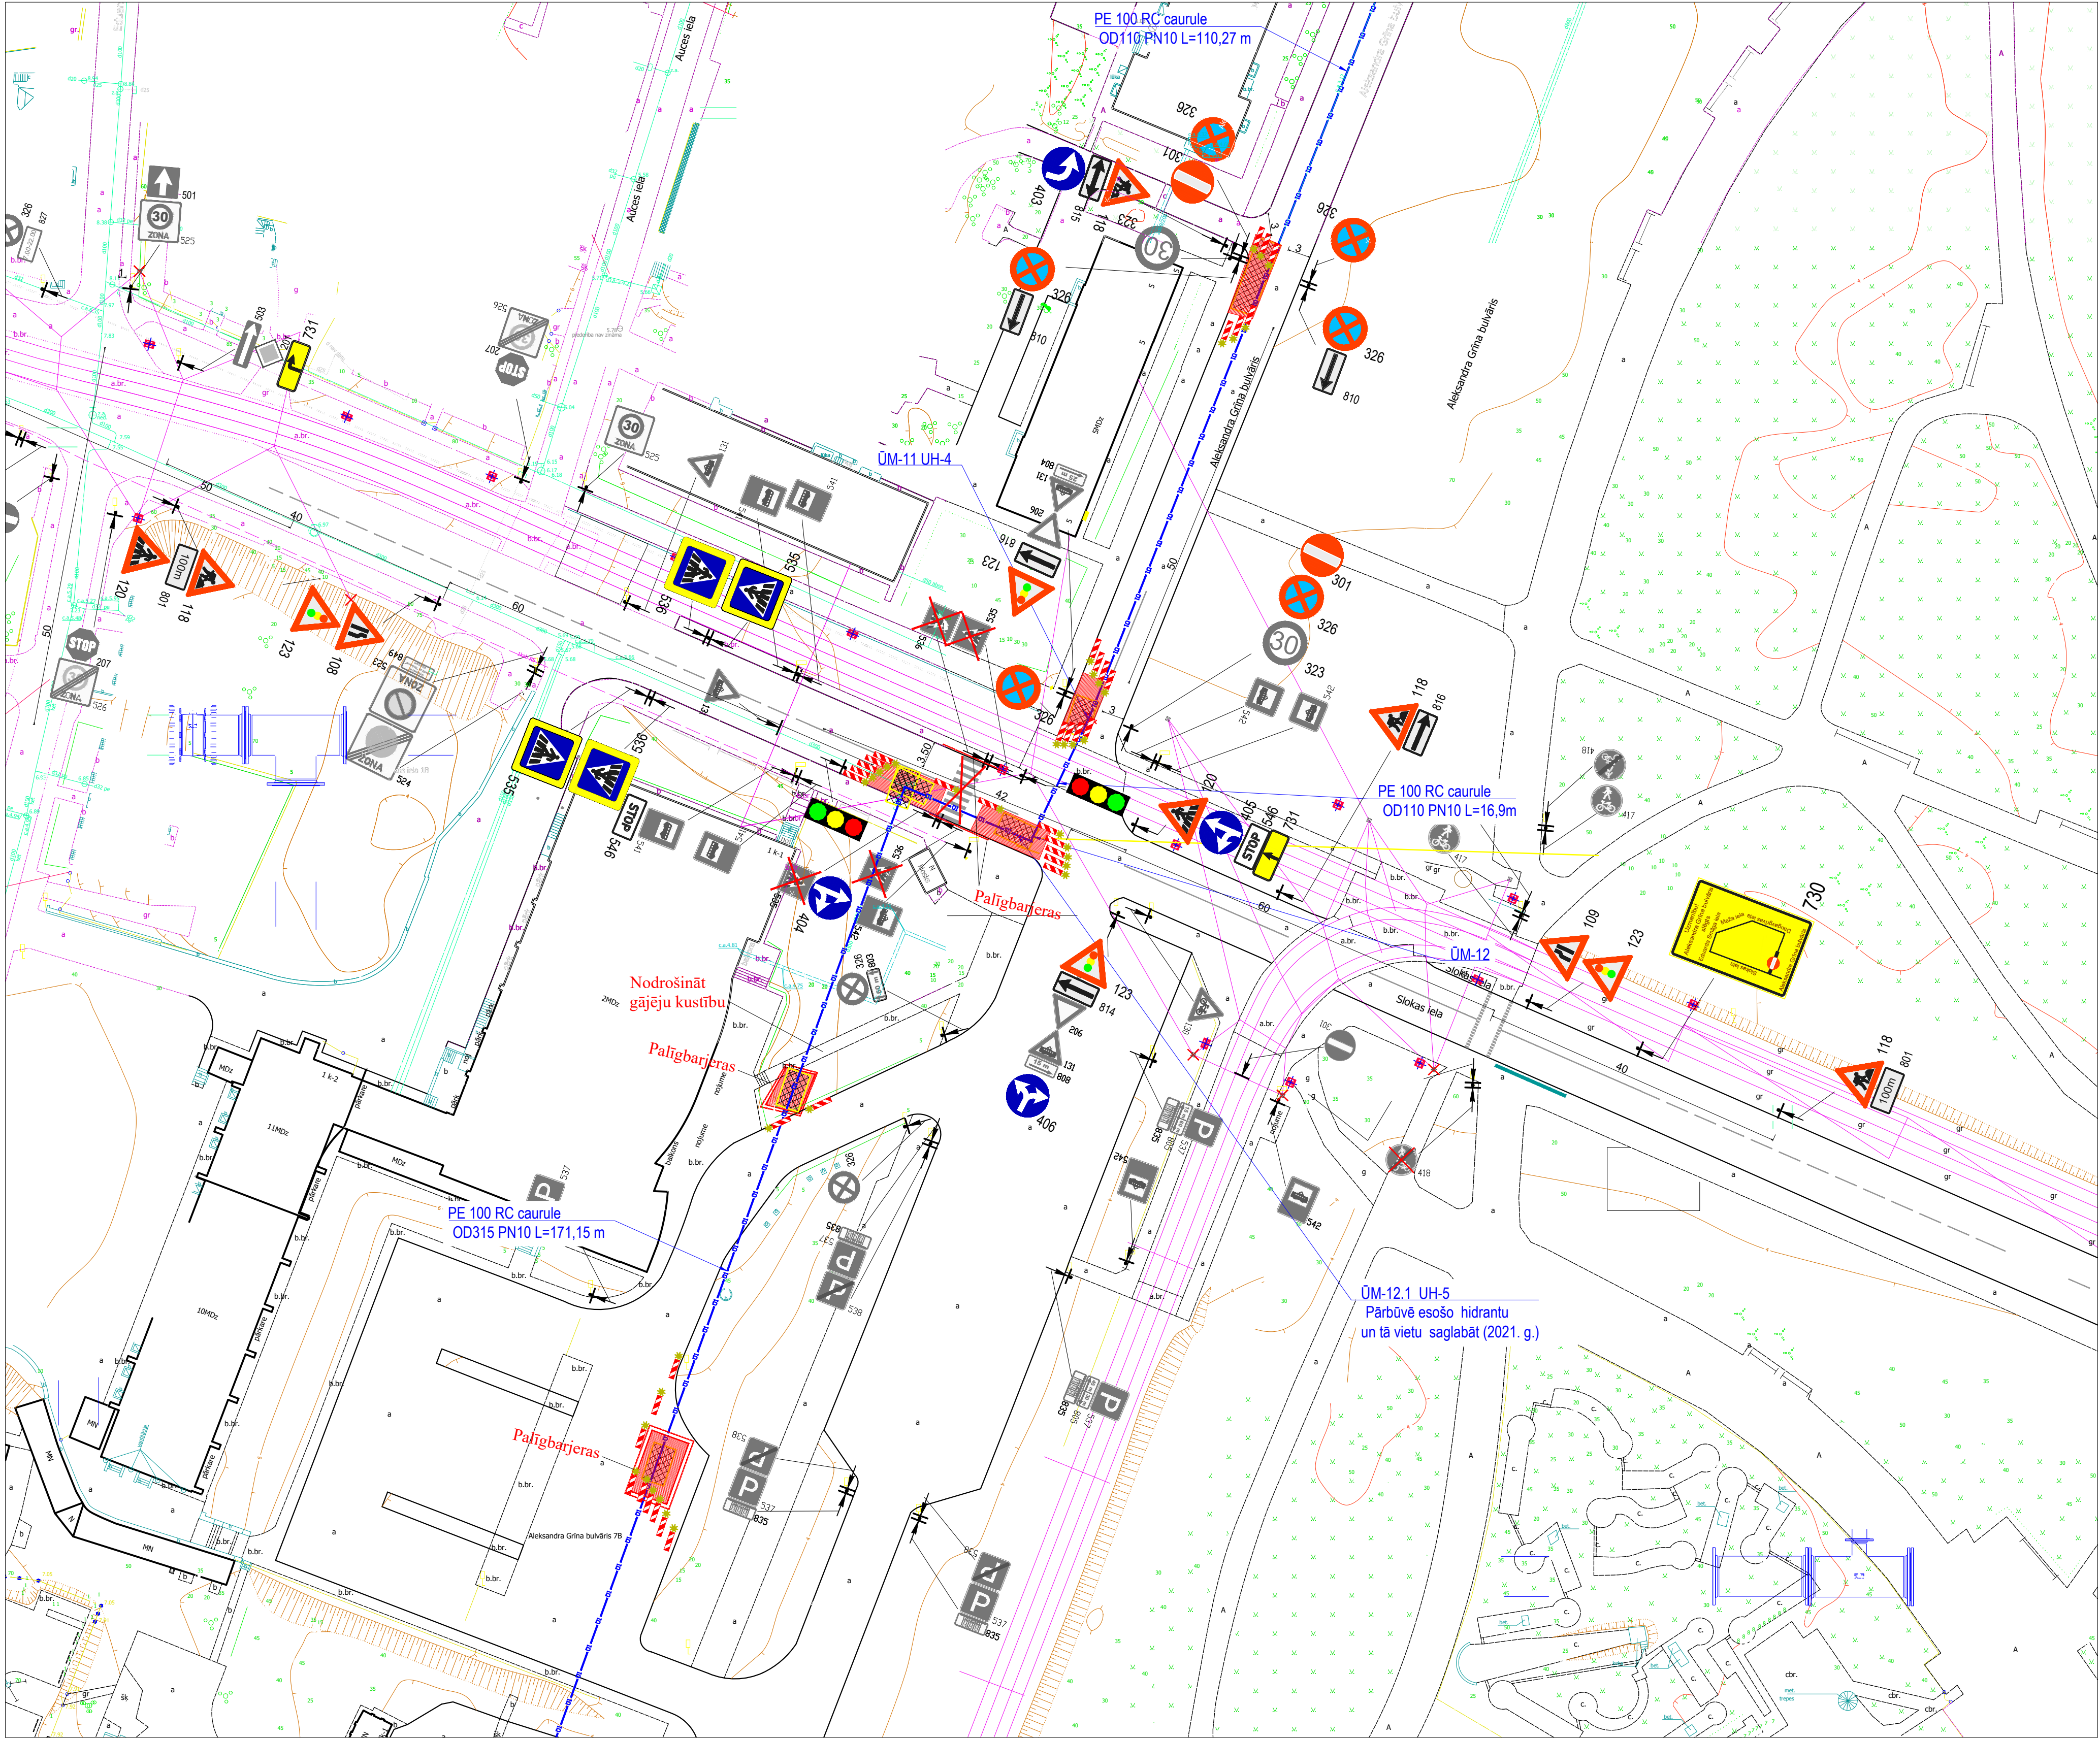

Saskaņojums derīgs ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības
Aizsargu un mobilitātes departamenta direktora rīkojumu

Shēma ir Darbu veikšanas
aizsargu neatņemama sastāvdaļa

Shēma derīga bezdarbu
kabinā un 10.000. rēķinā
Nr. 421

06.07.2026

PIEZĪMES

1. Ceļa zīmes atbilstoši LVS 77:2016 "Ceļa zīmes" un MK noteikumi Nr. 421 "Noteikumi par darbu vietu aprikošanu uz ceļiem" prasībām.
2. Aprikojot būvdarbu ar norobežojošām barjerām.
3. Nodrošināt iedzīvotāju un operatīvā transporta piekļūšanu slēgtā posma objektiem.
4. Darbu veicējs SIA "Rovlan Group" ierīko norobežojošās barjeras un tas apkalpo, mainot ceļa darbu vietas robežas, nodrošinot aprikojuma atbilstošu izvietojumu.
5. SIA "Rovlan Group" atbildīgais būvdarbu vadītājs - Kirils Pakovs, mob. tālr. 25444302.
6. Shēmas darbības laiks no _____ līdz _____
7. Pēc būvdarbu pabeigšanas pagaidu ceļa aprikojums tiek demontēts.
8. Darbus veikt pa posmiem.
9. Nodrošināt piekļūšanu objektiem slēgtā posma zonā. Pirms darbu uzsākšanas informēt objektu īpašniekus par ielas posma slēgšanas grafiku un braukšanas apgrūtinājumiem.
10. Norobežojuma barjeras Nr. 912 uzstādīt pirms satiksmi slēgtajiem ceļa darbu posmiem.
- Lietot vadstatņus Nr. 908/909 vai barjeras Nr. 910/911 darbu vietas norobežošanai no brauktuves
- Izmantot palīgbarjeras gājēju norobežošanai no darbu zonas.

APZĪMĒJUMI

- ceļa zīmes uzstādīšanas vieta un Nr.
- esošās ceļa zīmes
- demontētas ceļa zīmes
- būvdarbu zona
- palīgbarjeras
- gājēju kustības virziens

Saskaņots:

RP SIA "Rīgas satiksme"

ar nosacījumiem:

Diennakti pirms darbu uzsākšanas informēt vecāko

Centrāldispečeri pa tālr.: 80000008.

-Darbu veikšanu organizēt, neslēdzot un netraucējot sabiedriskā transporta satiksmi.

-Nodrošināt esošo elektrottransporta kontakttīkla uzskaites konstrukciju saglabāšanu levērot elektrottransporta kontakttīkla konstrukciju aizsardzības zonu: 1,0m no kontaktvada un atsaītes līnijas ass uz katru pusi.

-3 darba dienas pirms rakšanas darbu uzsākšanas saņemt atļauju darbu veikšanai RP SIA "Rīgas satiksme" elektrokabeļu aizsargjoslā, pieprasot saskaņošana@rigassatiksmelv.

-Diennakti pirms darbu uzsākšanas RP SIA "Rīgas satiksme" elektrokabeļu aizsargjoslā informēt RP SIA "Rīgas satiksme" pārstāvi.

-Darbi, kas saistīti ar zemes rakšanu esošā RP SIA "Rīgas satiksme" kabeļu aizsardzības zonā, jāveic bez rakšanas mehānismu pielietošanas. RP SIA "Rīgas satiksme" kabeļu līnijas izvietojumu un dziļumu precizēt darba gaitā atšurējot.

-Visā būvniecības laikā nepieciešamības gadījumā nodrošināt piekļuvi RP SIA "Rīgas satiksme" kabeļiem.

-Visā būvniecības laikā, nepieciešamības gadījumā, nekavējoties jānodrošina brīva piekļuve RP SIA "Rīgas satiksme" darbiniekiem un to rītentransportlīdzekļiem kontakttīkla konstrukciju profilaktisko un avārijas darbu veikšanai.

RP SIA "Rīgas Satiksme"

Mārtiņš Plataiskalns

parakstīts elektroniski

Vecākais inženierkomunikāciju

Piesaistes inženieris

06.07.2026.

BIS lietas numura nav.

Shēma 4 (ūdensvada remonts ar sagraušanas metodi).

Saava-LV SIA "Saava-LV", Alksnes iela 2, Rīga LV 1046 Vien.reģ.Nr. 40103129708, P.V.Nr. LV 40103129708 Tālr.: 7312227, 7613303, Faks: 7313303 Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 3620-R		Pasūtītājs SIA "Rovlan Group"		
Objekts Aleksandra Grīna bulvāris, Rīga		Stadija	Marka	Lapas Nr.
		TP	GT	1
Sastādīja	S.Kazarovcevs tālr. 26495379 e-pasts: sergejs.kazarovcevs@gmail.com	17.06.2026	Ceļu satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu uzstādīšanas shēma	
			Mērogs: bez mēroga	
