Pielikums
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta direktora rīkojumam
“Par satiksmi Kurzemes prospektā”

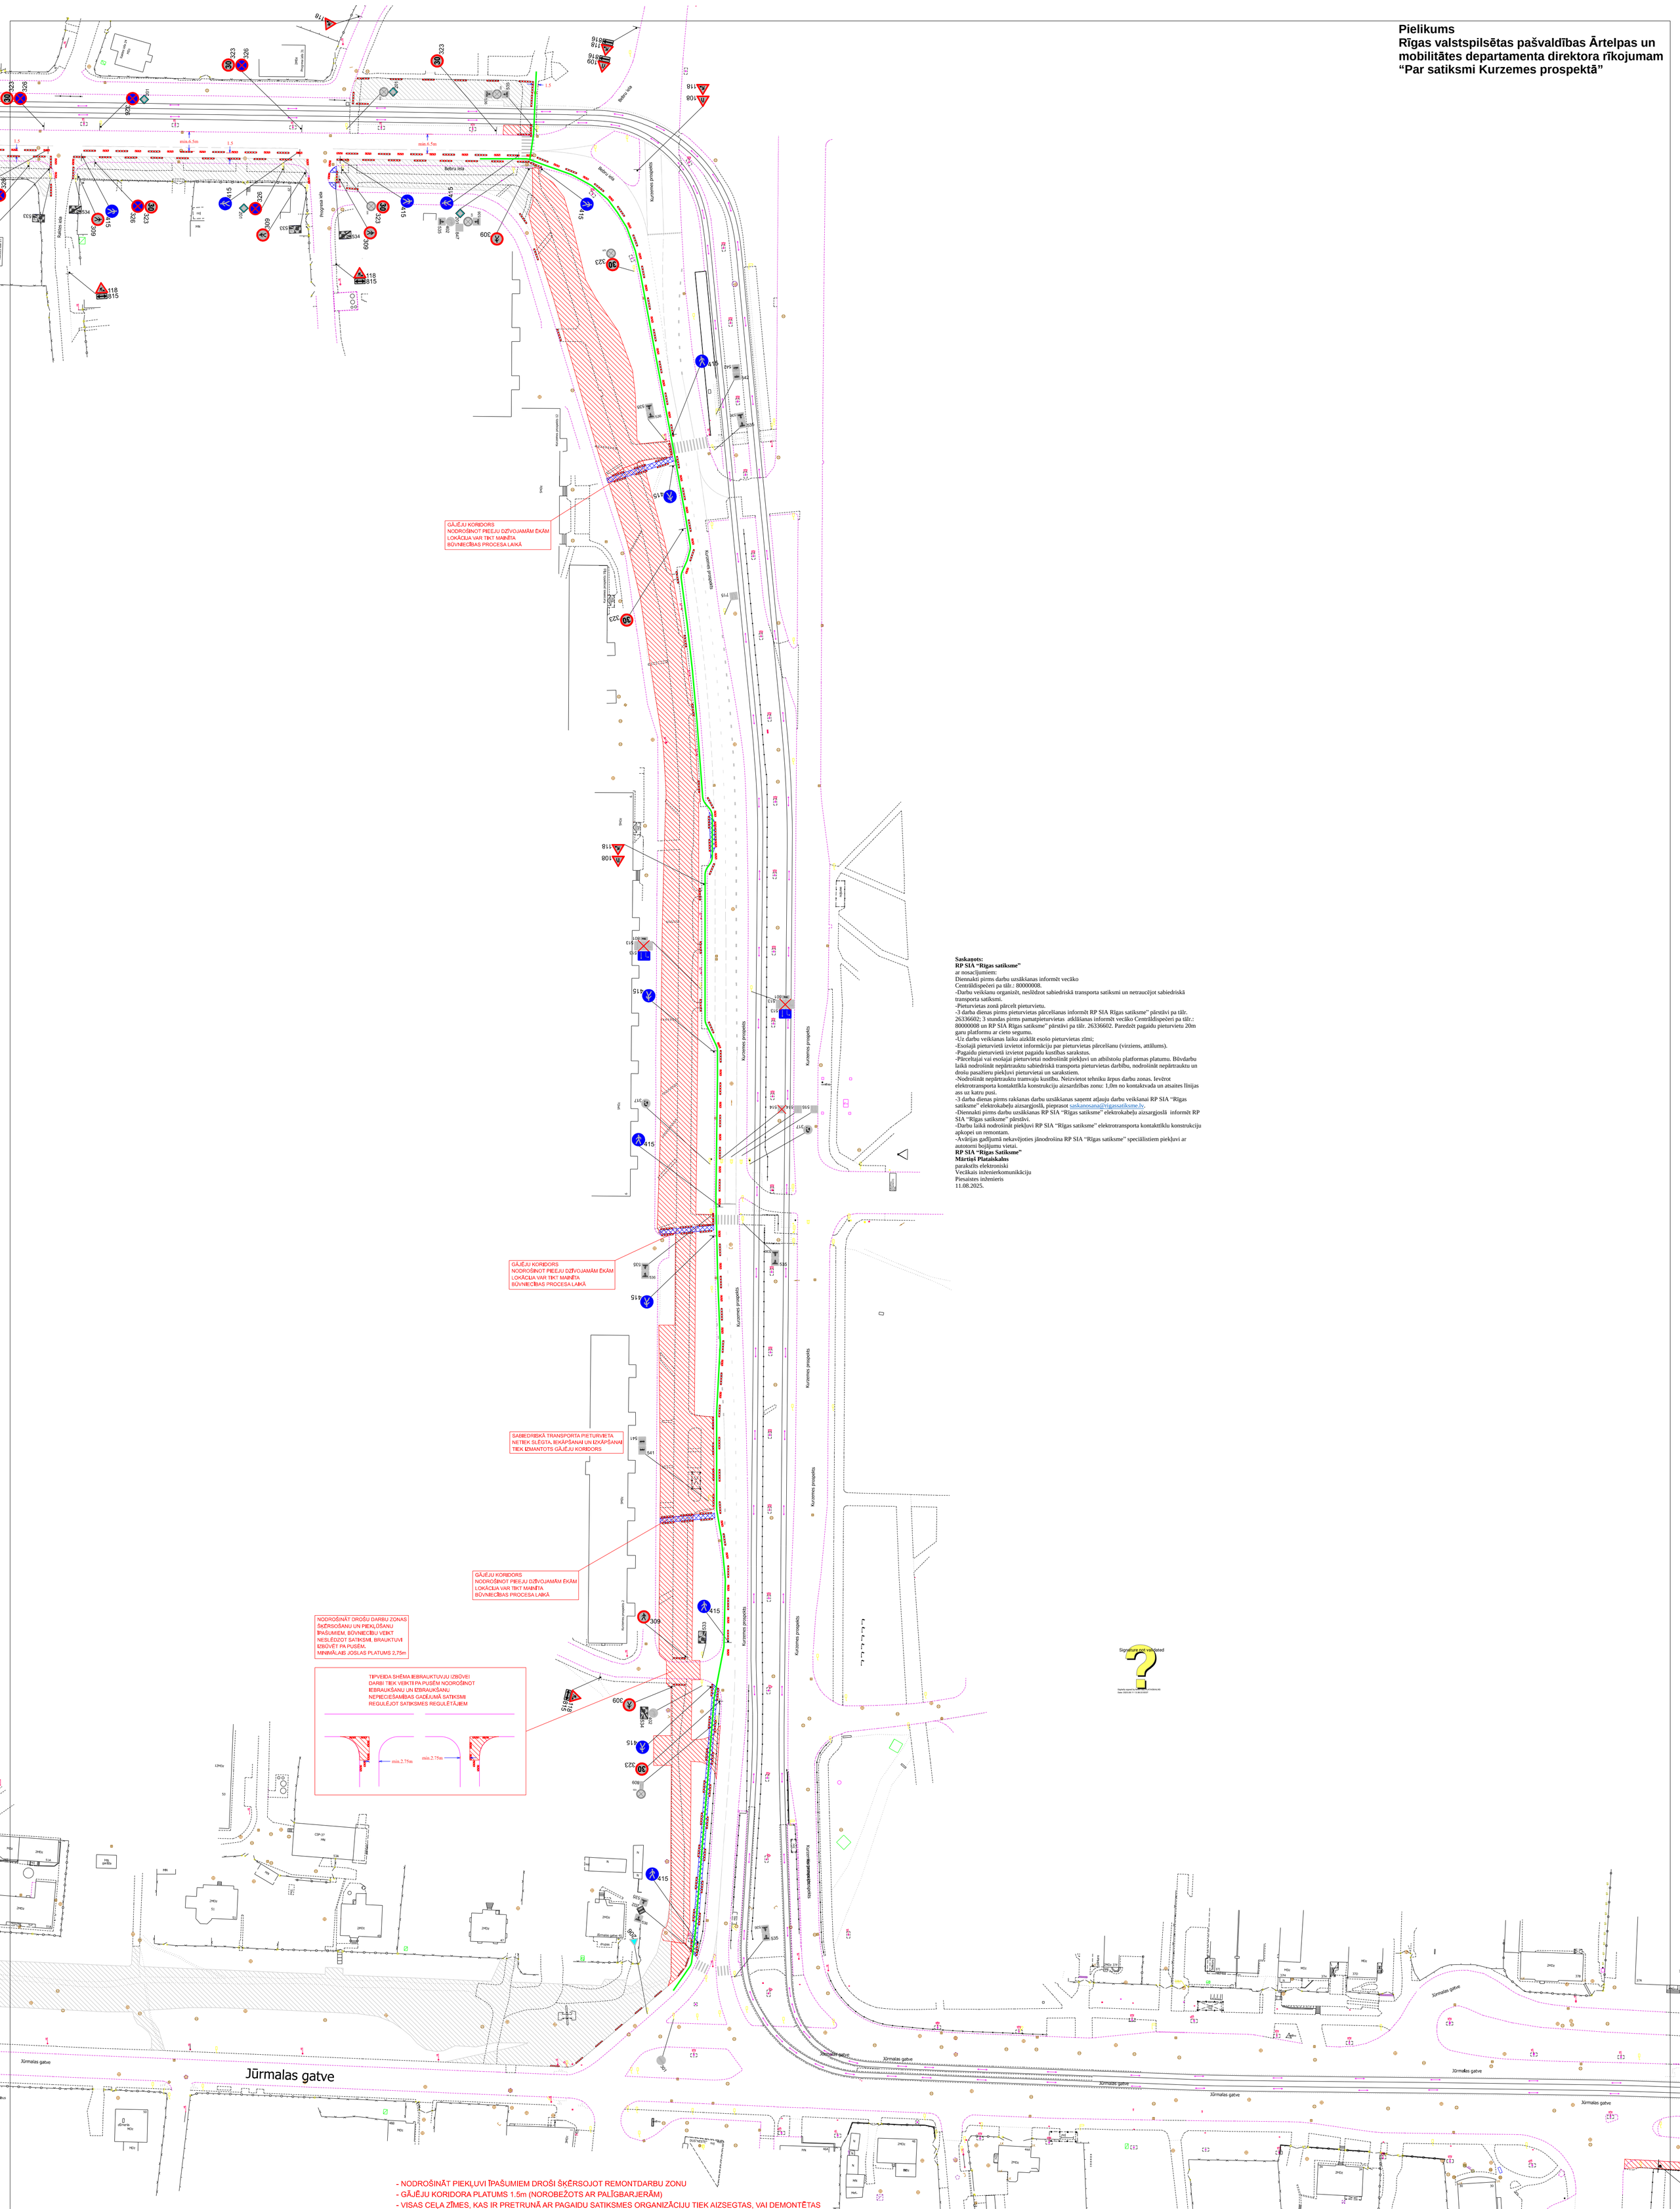

Saskaņots:
RP SIA “Rīgas satiksme”
ar nosacījumiem:
Diennakti pirms darbu uzsākšanas informēt vecāko
Centrāldispečeri pa tālr.: 80000008.
-Darbu veikšanu organizēt, neslēdzot sabiedriskā transporta satiksmi un netraucējot sabiedriskā transporta satiksmi.
-Pieturvietas zonā pārcelt pieturvietu.
-3 darba dienas pirms pieturvietas pārcelšanas informēt RP SIA Rīgas satiksme” pārstāvi pa tālr. 26336602; 3 stundas pirms pamatpieturvietas atklāšanas informēt vecāko Centrāldispečeri pa tālr.: 80000008 un RP SIA Rīgas satiksme” pārstāvi pa tālr. 26336602. Paredzēt pagaidu pieturvietu 20m garu platformu ar cieto segumu.
-Uz darbu veikšanas laiku aizklāt esošo pieturvietas zīmi;
-Esošajā pieturvietā izvietot informāciju par pieturvietas pārcelšanu (virziens, attālums).
-Pagaidu pieturvietā izvietot pagaidu kustības sarakstus.
-Pārceļtajai vai esošajai pieturvietai nodrošināt piekļuvi un atbilstošu platformas platumu. Būvdarbu laikā nodrošināt nepārtrauktu sabiedriskā transporta pieturvietas darbību, nodrošināt nepārtrauktu un drošu pasažieru piekļuvi pieturvietai un sarakstiem.
-Nodrošināt nepārtrauktu tramvaju kustību. Neizvietot tehniku ārpus darbu zonas. Ievērot elektrotransporta kontaktīkla konstrukciju aizsardzības zonu: 1,0m no kontaktvada un atsaites līnijas ass uz katru pusi.
-3 darba dienas pirms rakšanas darbu uzsākšanas saņemt atļauju darbu veikšanai RP SIA “Rīgas satiksme” elektrokabeļu aizsargjoslā, pieprasot saskanosana@rigassatiksme.lv.
-Diennakti pirms darbu uzsākšanas RP SIA “Rīgas satiksme” elektrokabeļu aizsargjoslā informēt RP SIA “Rīgas satiksme” pārstāvi.
-Darbu laikā nodrošināt piekļuvi RP SIA “Rīgas satiksme” elektrotransporta kontaktīklu konstrukciju apkopei un remontam.
-Avārijas gadījumā nekavējoties jānodrošina RP SIA “Rīgas satiksme” speciālistiem piekļuvi ar autotorni bojājumu vietai.
RP SIA “Rīgas Satiksme”
Mārtiņš Plataiskalns
parakstīts elektroniski
Vecākais inženierkomunikāciju
Piesaistes inženieris
11.08.2025.

Signature not validated
Digitally signed by
Date: 2025.08.11 12:28:53 EEST

BIS lietas Nr.: BIS-BL-743111-106878

SHĒMAS NR.	SATIKSMES ORGANIZĀCIJAS IZSTRĀDĀTĀJS:				PASŪTĪTĀJS:
7.	SIA KMK PROJEKTS info@kmkprojekts.lv				SIA VIA tel.: 26266750 via@via.com.lv
		UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	OBJEKTS: REĢIONĀLAS UN PILSĒTAS NOZĪMES VELO INFRASTRUKTŪRAS IZVEIDE MARŠRUTĀ RĪGA - BABĪTE - PIŅĶI
RASĒJA	SIA KMK PROJEKTS	M.KRIŽEVICS			
PĀRBAUDĪJA	SIA KMK PROJEKTS	R.KASNIĶOVSKIS			
					RASĒJUMS: DARBA VIETAS APRĪKOJUMA SHĒMA REMONTDARBU LAIKĀ

- NODROŠINĀT PIEKĻUVI ĪPAŠUMIEM DROŠI ŠĶĒRSOJOT REMONTDARBU ZONU
- GĀJĒJU KORIDORA PLATUMS 1.5m (NOROBEŽOTS AR PALĪGBARJERĀM)
- VISAS CEĻA ZĪMES, KAS IR PRETRUNĀ AR PAGAIDU SATIKSMES ORGANIZĀCIJU TIEK AIZSEGTAS, VAI DEMONTĒTAS
- NODROŠINĀT VISA VEIDA SATIKSMI
- DARBU VIETU APRĪKOT ATBILSTOŠI MK NOTEIKUMIEM NR.421
- DARBU VIETU APRĪKOT AR VADSTATŅIEM / PALĪGBARJERĀM
- DARBU ILGUMS - 4 MĒNEŠI
- VEICAMIE DARBI - VELO INFRASTRUKTŪRAS IZBŪVE, BRAUKTUVES REMONTDARBI
- ATBILDĪGAIS PAR DARBU VIETAS APRĪKOJUMU: MAREKS KRŪMIŅŠ (BŪVDARBU VADĪTĀJS) tel.: 26266750

DARBU ZONA
PAGAIDU IETVE (1.5m PLATA)
206 ESOŠA CEĻAZĪME
118 UZSTĀDĀMA CEĻAZĪME
GĀJĒJU MARŠRUTS

Saskaņojums derīgs ar Rīgas valstspilsētas Ārtelpas un Mobilitātes departamenta direktora rīkojumu
Shēma ir Darbu veikšanas atļaujas neatņemama sastāvdaļa
Shēma izstrādāta ievērojot Ministru kabineta 02.10.2001. noteikumus Nr. 421
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta Satiksmes organizācijas un kontroles drošības nodaļas satiksmes organizācijas speciālists
A.Šmilga
8 -08- 2025
