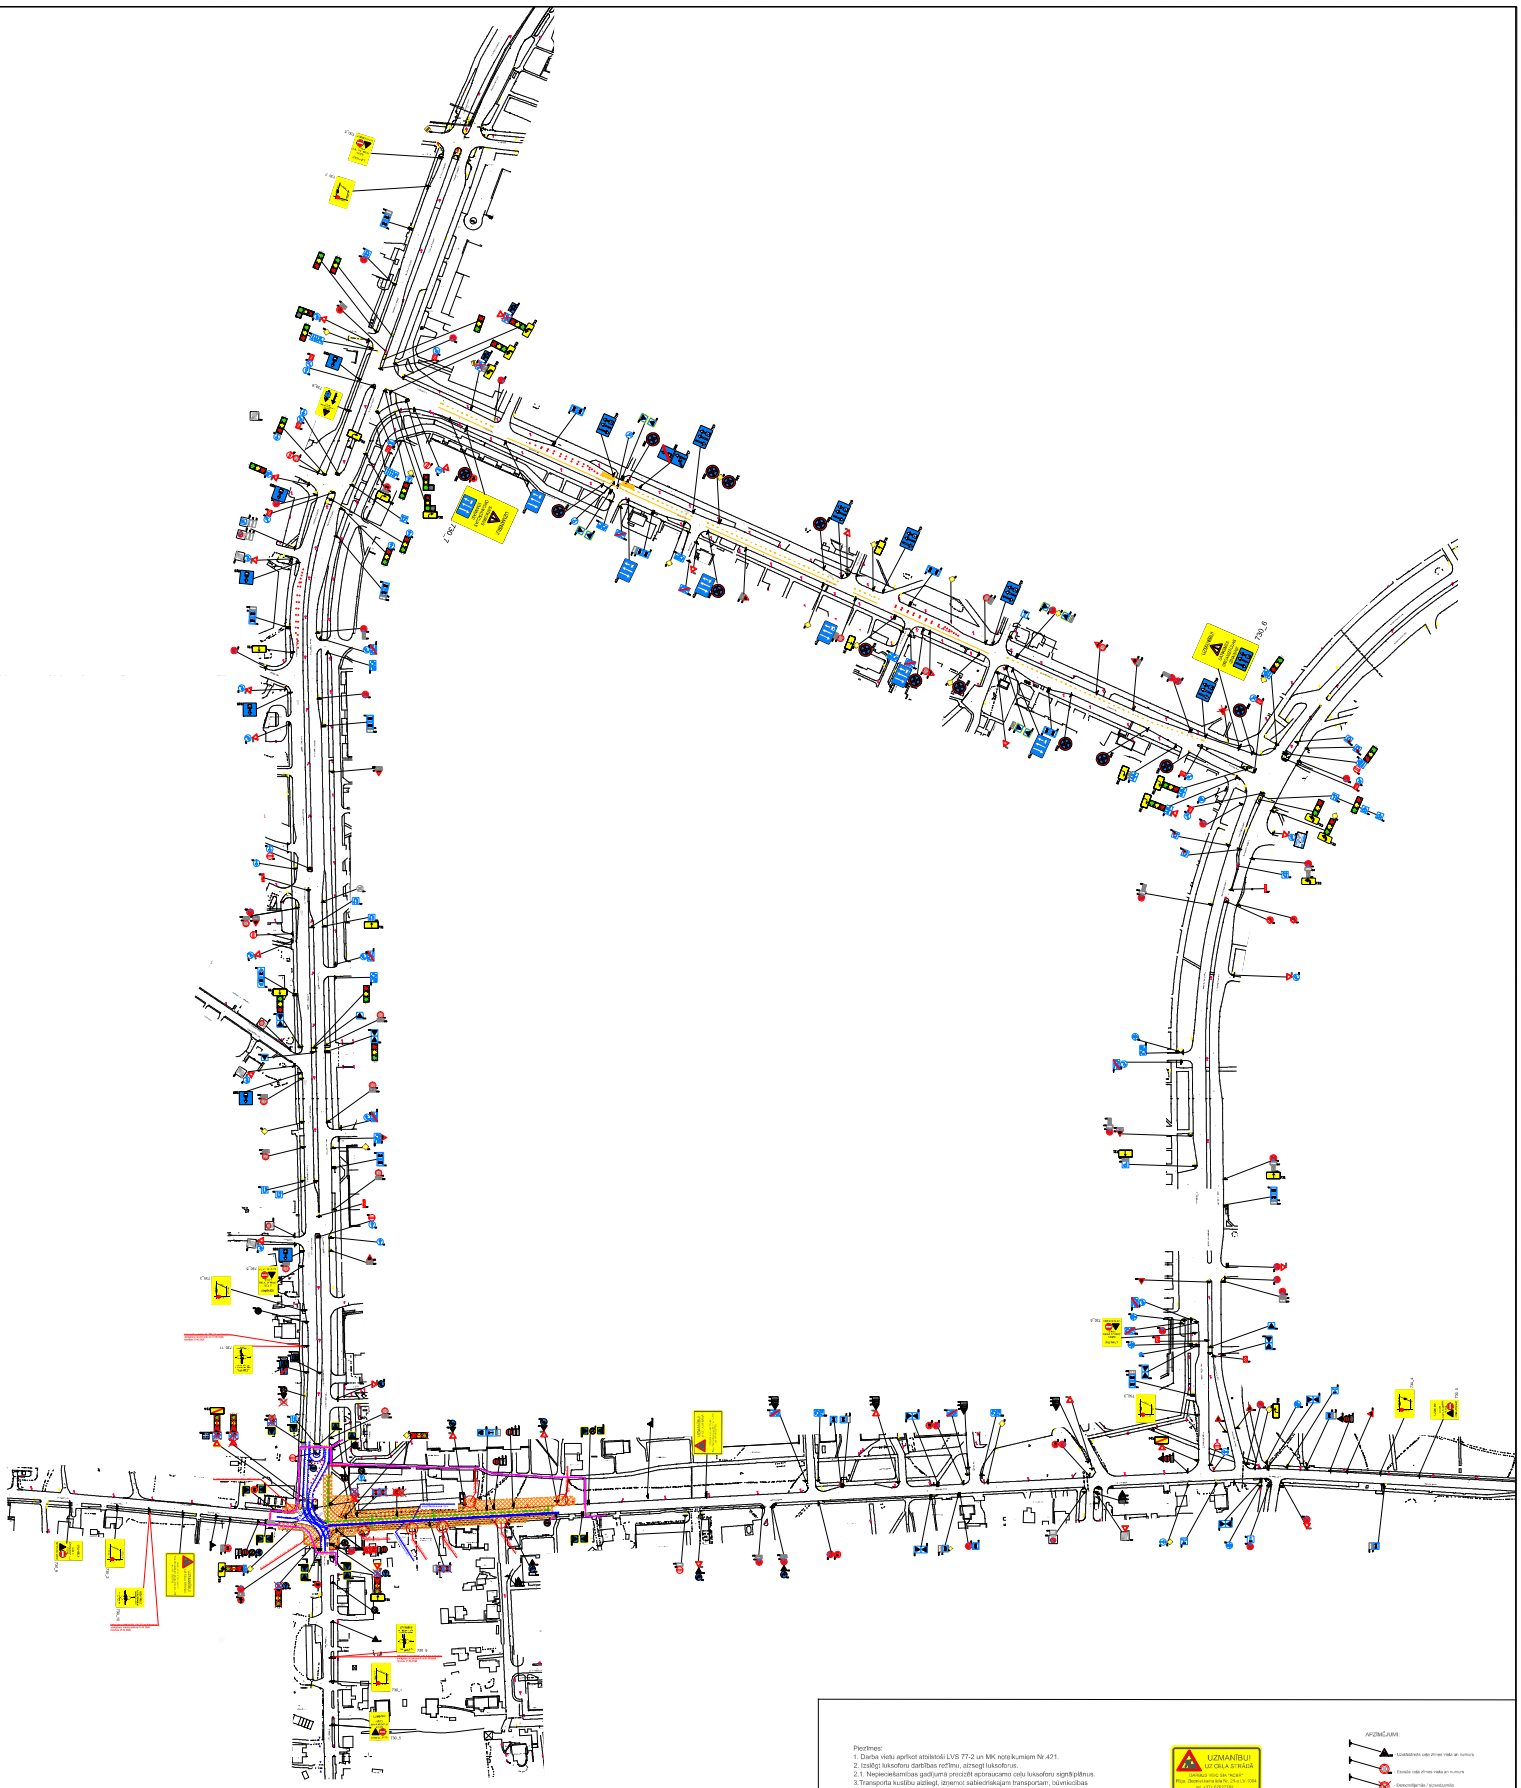

Saskaņots:
RP SIA "Rīgas satiksme"
ar nosacījumiem:
-Darbu veikšanu organizēt, neiedzot un netraucējot sabiedrisko transporta satiksmi.
-Nodrošināt autobusu pagrieziena rādiusus, sastrēgumu gadījumos veikt satiksmes regulēšanu prioritāti dodot sabiedriskajam transportam.
-Marķētu izmaiņas saskaņot ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un Mobilitātes departamenta direktora rīkojumu.
RP SIA "Rīgas Satiksme"
Mārtiņš Plataiskalns
parakstīts elektroniski
Vecākais inženierkomunikāciju
Posaistes inženieris
25.05.2026.

Piezīmes:
1. Darba vietu aplikt atbilstoši LVS 77-2 un MK noteikumiem Nr.421.
2. Izslēgt luksoforu darbības režīmu, aizsegt luksoforus.
2.1. Nepieciešamības gadījumā precīzāk apronācamo ceļu luksoforu signālplānus.
3.Transporta kustību atšķiest, īpaznmot sabiedriskajam transportam, īsākcikliskas transportam. Jūrmalas gatves 101A apmeklētājiem un mājas ieejas vietām būvdarbu zonā. Nodrošināt operatīvo satiksmi.
Sabiedriskā transporta plūsma caur būvobjektu vai pa apvedceļu liek saskaņota ar Rīgas satiksmi, atbilstoši kalendārajam grafikam.
4. Jūrmalas gatves pieturvietas (Zolitūdes iela un Dubultu iela) uz būvdarbu laiku pārcelt uz citām pieturvietām (sk.shēmu.).
5.Pēc darba laika beigām vai brīvdienās nav paredzētas satiksmes organizācijas izmaiņas.
6.SO shēma nr.5 darbosies paralēli lokālām SO shēmām, kur būs paredzēti atlīdzīgi SO risinājumi.
7.Darbu veicējam ir tiesības regulēt satiksmi darbu veikšanas laikā, ja rodas nepareizotā apstākļi, kurus ar darba vietas aprīkojuma shēmā esošajiem lietrīkojumiem nav iespējams novērst (MK not. Nr.421 punkts 20.).
8. Nodrošināt minimālo joslas platumu 2.75m.
9. Nodrošināt gājēju ietves platumu 1.5m. Izveidot pagaidu gājēju pārejas. Gājēju ceļu norobežot no būvdarbu zonas.
10. Plānotais būvdarbu laiks 01.06.2026 - 30.11.2026.
11. Shēmas darbības laiks atbilstoši kalendārajam grafikam.
12. Veicamie darbi: ugunsdzēsēju komunikāciju izbūve, zemes darbi, segas izbūves darbi, asfaltēšanas darbi, labiekārtošanas darbi.
13. Darbus veic SIA ACBR, atbildīgais būvdarbu vadītājs - Dāvis Serdāns.
atbildīgais par satiksmes organizāciju objektā - būvdarbu vadītājs
Vladimirs Popovs (m.26118436).

14. Apbraucamā ceļa organizēšana Zemenes ielā:
- novākt apstādījumu un stāvlaukuma atdīgšanu;
- izveidot trīs joslu brauktuvi;
- virzienā uz Kurzemes prospektu labo joslu paredzēt kā autobusu joslu ar minimālo platumu 3,00 m.
15. Apbraucamā ceļa organizēšanai Kurzemes prospektā:
- virzienā uz Jūrmalas gatvi labo joslu, 18tr pagaidu gājēju pārejai uz Kurzemes prospekta, paredzēt kā autobusu joslu ar minimālo platumu 3,50 m.

16. Nodrošināt sabiedriskā transporta kustībai caur būvdarbu zonu Jūrmalas gatvē vismaz 3,0 m platu braukšanas koridoru un samaināmās kabatu 30m, atbilstoši būvdarbu organizācijas posmam un veicamo darbu specifika.

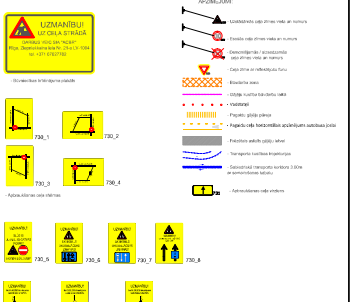

Shēmas Nr.5 Lapa 1	SPEJĀTĀJS: ACBR	SIA ACBR Tīnūžkalna iela 21A, Rīga, LV 1004 Tālrunis: 67027192 e-pasta: info@acbr.lv	IZRAKSTĪTĀJS: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments Gaisīšu iela 38, Rīga, LV-1311 e-pasta: info@riga.lv tālrunis: +371 80001201		
		Uzvārds	Paraksts	Datums	OBJEKTS:
Rondēšu vad.		V.Popovs			Jūrmalas gatves 3 joslu pārbūvēšana Kurzemes prospektam līdz Zolitūdes ielas – pārbūve
Izstrādāja		A.Kapane			
Saskaņoja					MASŠTABS: Satiksmes organizācija būvdarbu laikā
Saskaņoja					
Pasūtītājs					
