

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta direktora rīkojumam
"Par satiksmi Ropažu ielā"

Pielikums

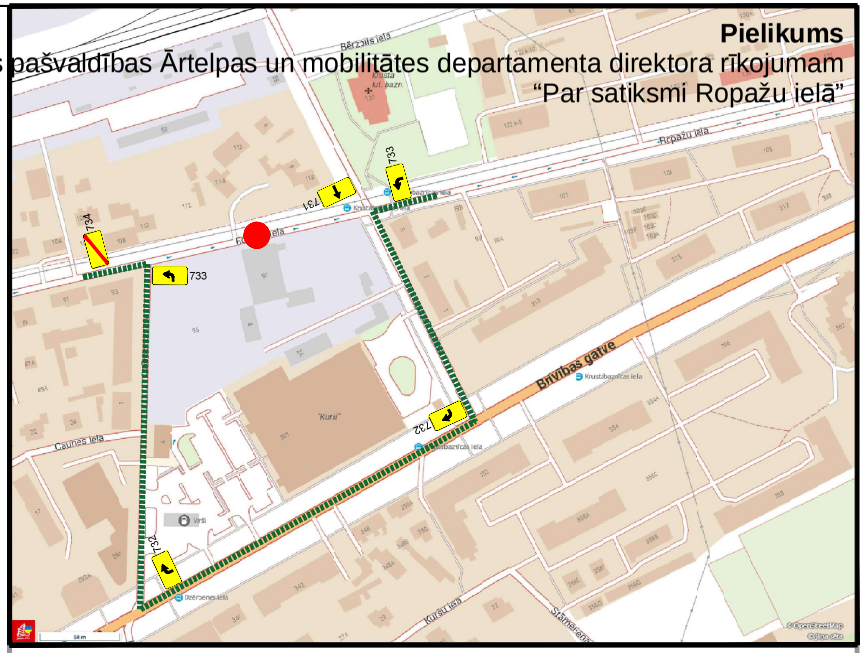

Apvedceļi

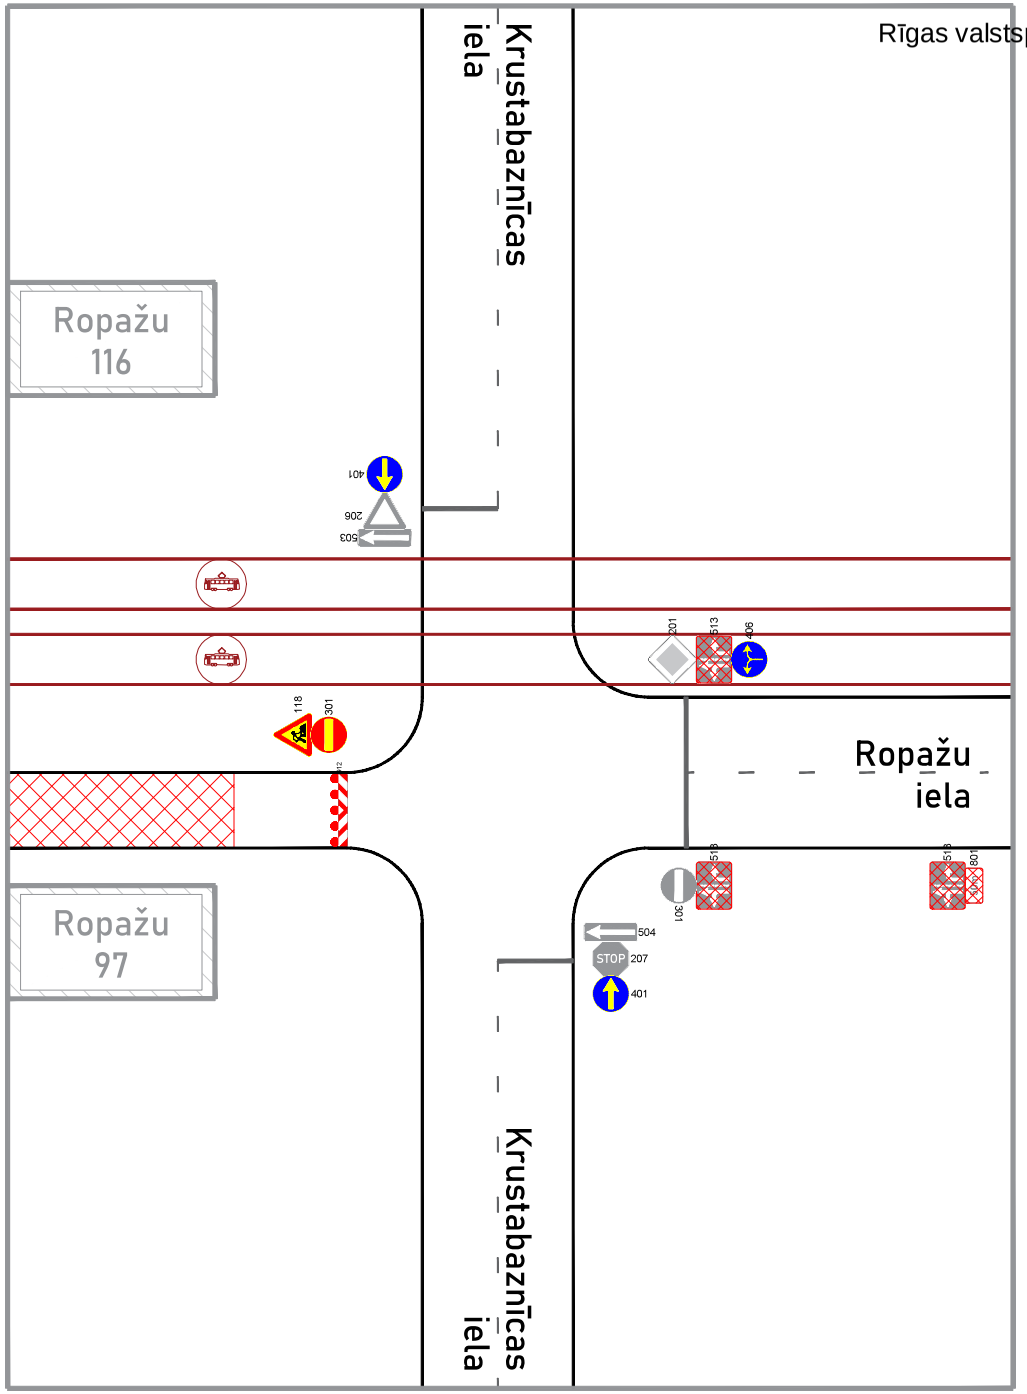

7 dienas pirms darbu uzsākšanas uzstādīt
Informatīvos plakātus par paredzētajiem darbiem.

Saskaņojums derīgs ar Rīgas valstspilsētas Ārtelpas un Mobilitātes Departamenta direktora rīkojumu

Shēma ir Darbu veikšanas atļaujas neatņemama sastāvdaļa

Shēma derīga ieviešot Ministru kabineta 02.10.2001. noteikumus Nr. 421

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta Satiksmes organizācijas un kustības drošības nodaļas satiksmes organizācijas speciālists

A.Šmilga

22.07.2026.

Saskaņots:
RP SIA "Rigas satiksme"
ar nosacījumiem:
Diennakti pirms darbu uzsākšanas informēt vecāko Centrāldispečeri pa tālr.80000008.
-Darbu veikšanu organizēt, neiekļūstot un netraucējot sabiedriskā transporta satiksmi. Nodrošināt nepārtrauktu tramvaju kustību pa TKT.
-Nodrošināt esošo elektrotransporta kontakttīkla uzkarsistēmas konstrukciju saglabāšanu ievērot elektrotransporta kontakttīkla konstrukciju aizsardzības zonu: 1,0m no kontaktvada un atsaites līnijas ass uz katru pusi.
-Neko nestiprināt pie trolejbusu uzkarsistēmas elementiem.
-Visā būvniecības laikā, nepieciešamības gadījumā, nekavējoties jānodrošina briva piekļuve RP SIA "Rigas satiksme" darbiniekiem un to rīcībā esošajiem kontakttīkla konstrukciju profilaktisko un avārijas darbu veikšanai.
RP SIA "Rigas Satiksme"
Mārtiņš Plataiskalns
parakstīts elektroniski
Vecākais inženierkomunikāciju
Priesaistes inženieris
22.07.2026.

Binders

Sagat.	Sat.org.inženieris	I.Gailišs		22.07.2026
Pārb.	Sat.org.darbu vad.	M.Blušs		

Būvdarbus veic: Ceļu būves firma SIA "Binders"
Būvdarbu vadītājs: Ainārs Karlsons Tel: 29 394 674
Shēmas darbības laiks atbilstoši kalendārajam grafikam

Apzīmējumi: Jauna c/z; Esoša c/z; Esoša apsedzama c/z; Esoša demontējama c/z; Darbu zona; Gājēju zona; Gājēju barjera; Pagaidu horizontālie apzīmējumi

Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietojuma shēma

Objekts: Ceļa seguma atjaunošana pēc ūdensvada un kanalizācijas tīklu remonta darbiem.

Apraksts: 1.Darba vieta tiks aprīkota pec M-K noteikumiem nr.421 "Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem".
2.Pagaidu ceļazīmes tiek uzstādītas ievērojot LVS 77-2 uzstādīšanas noteikumus.
3.Satiksmes organizācijas shēma paredzēta: Seguma atjaunošana pēc tīklu remontdarbiem.
4.Škērsnorobežojums - Barjera, vai vienpusīgie vadstatņi maks. 2m attālumā cits no cita, slīpumā 1:2 pret brauktuves malu.
5.Garennorobežojums - divpusīgie vadstatņi maks. 10m attālumā cits no cita.
6.Darbus plānots veikt tikai nakts laikā.

Atbildīgais par darba vietas aprīkojumu: CBF SIA "BINDERS" Sat.org. darbu vadītājs M.Blušs tel. 25480134 epasts: martins.blums@binders.lv

Ropažu 116
