Pielikums
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta direktora rīkojumam
"Par satiksmi Progresa ielā"

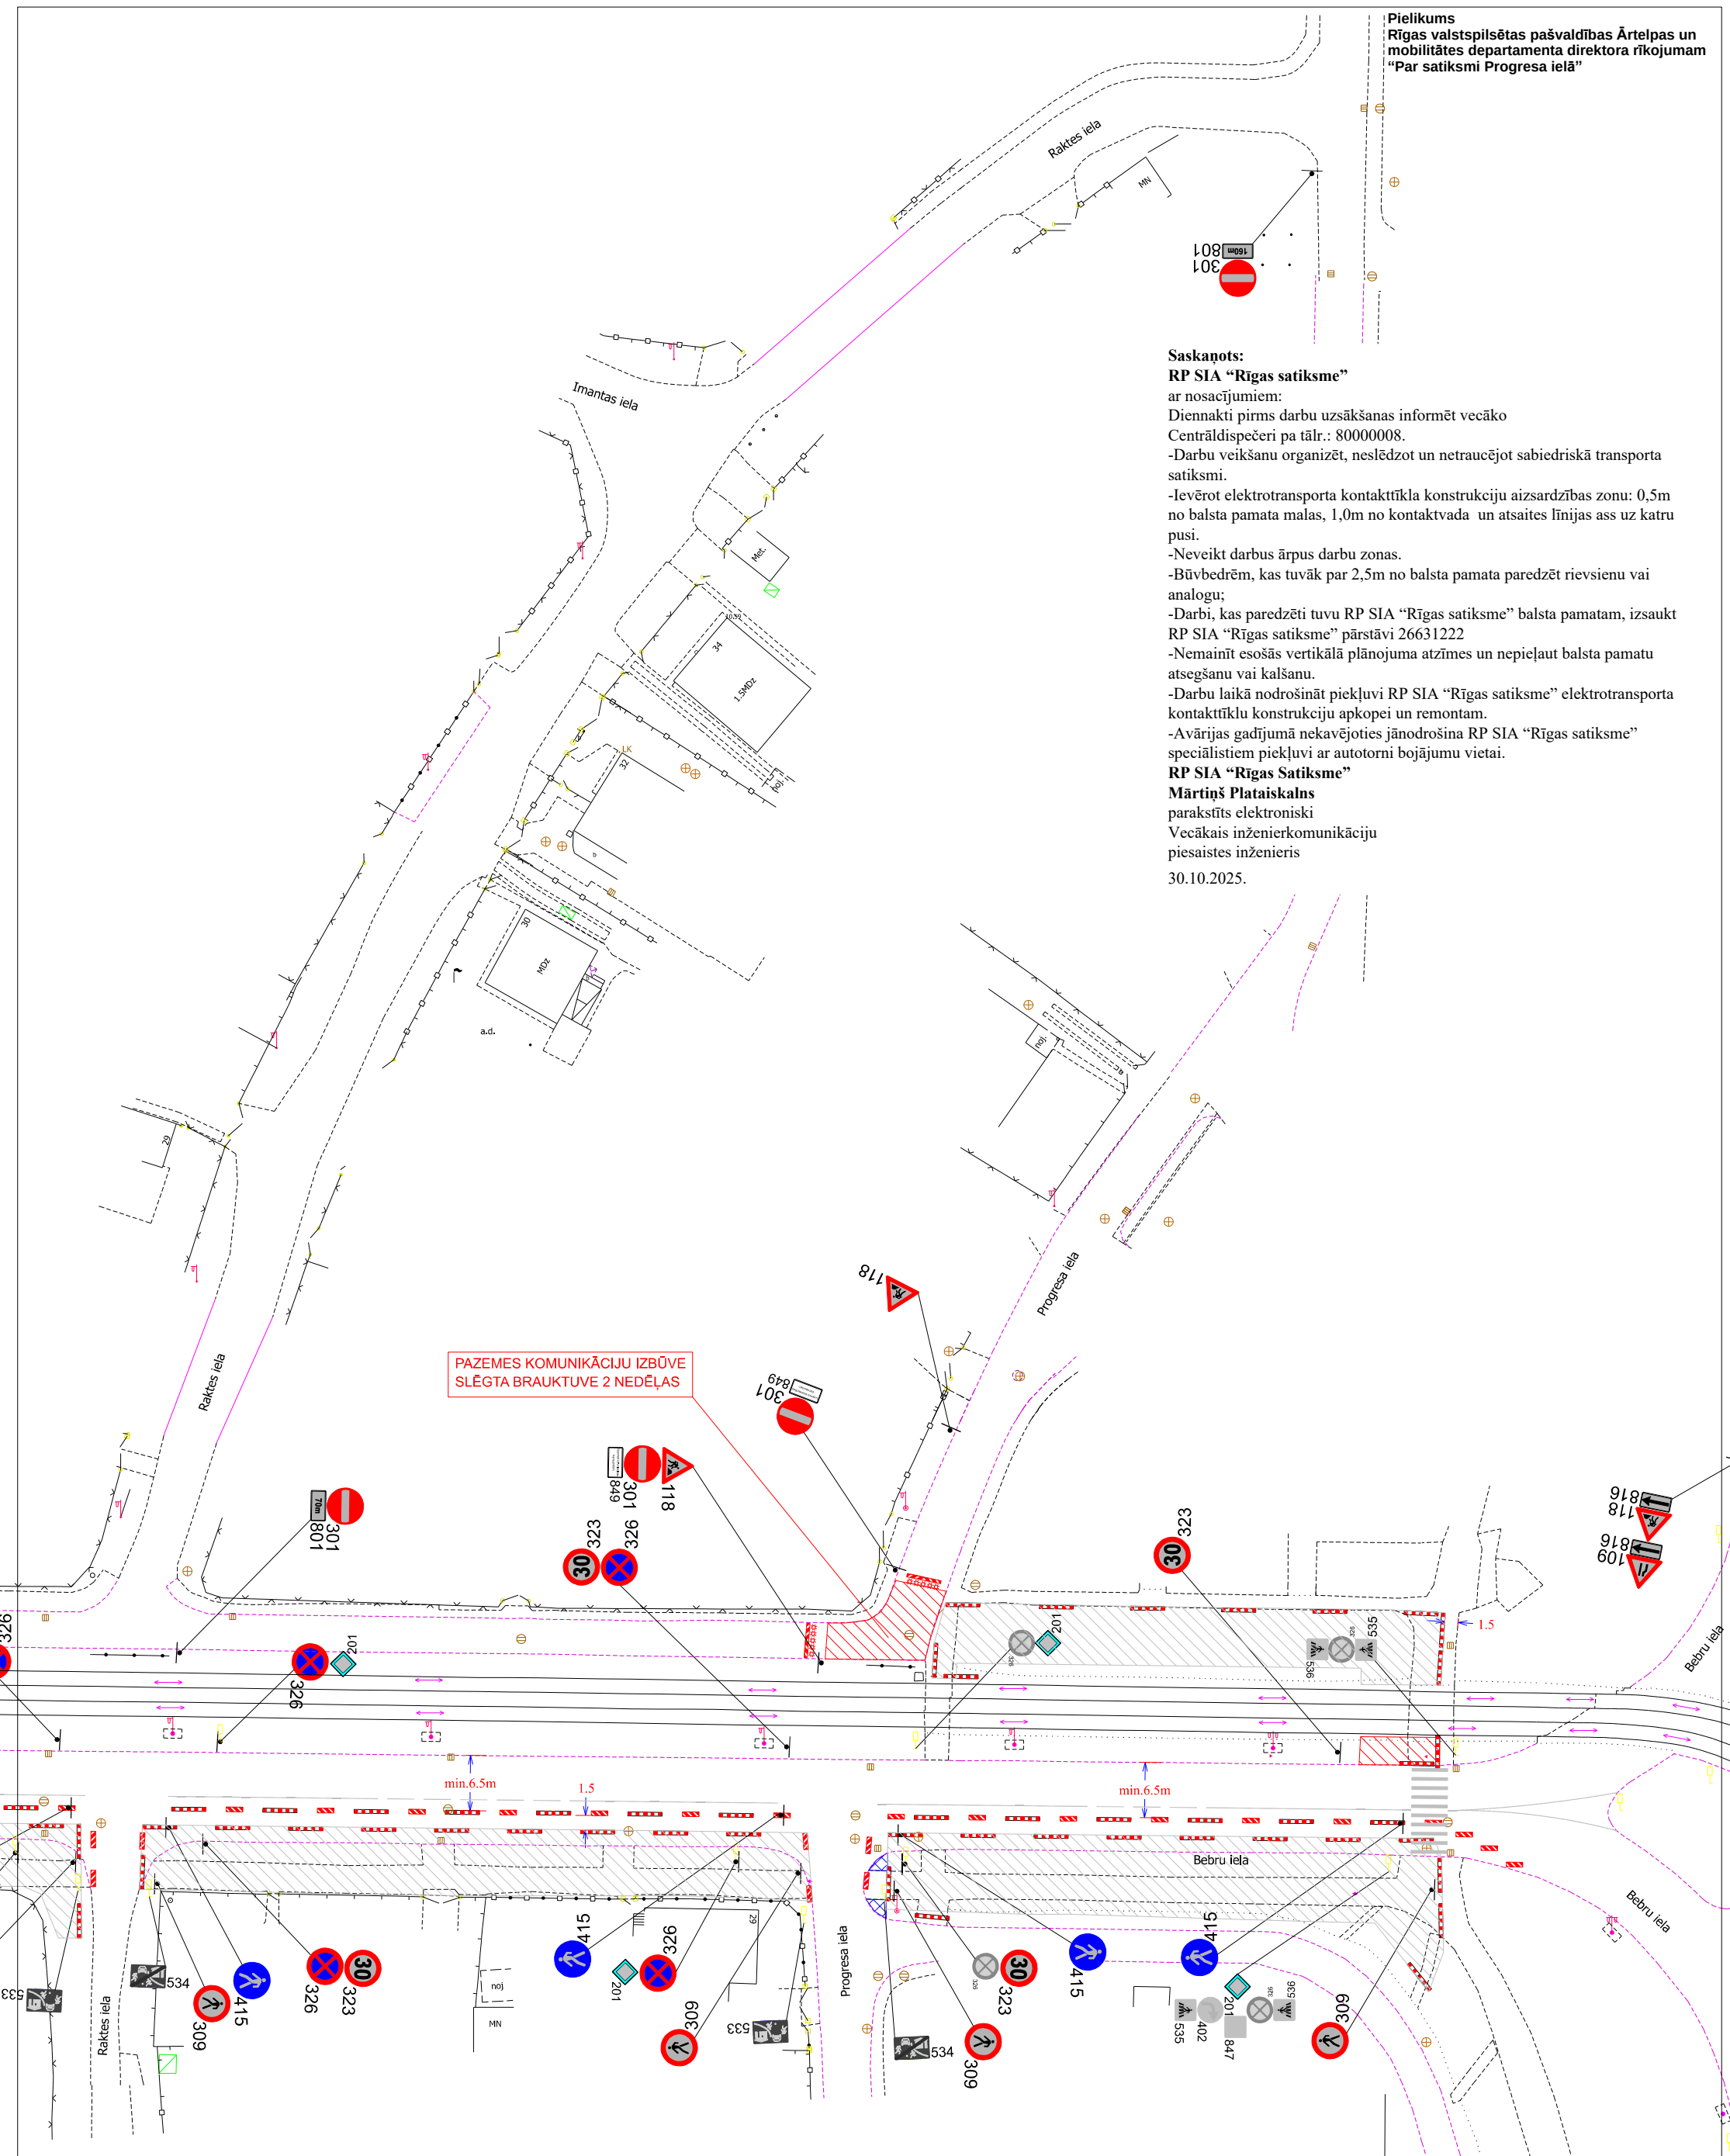

Saskaņots:
RP SIA "Rīgas satiksme"
ar nosacījumiem:
Diennakti pirms darbu uzsākšanas informēt vecāko Centrāldispečeri pa tālr.: 80000008.
-Darbu veikšanu organizēt, neslēdzot un netraucējot sabiedriskā transporta satiksmi.
-Ievērot elektrotransporta kontakttīkla konstrukciju aizsardzības zonu: 0,5m no balsta pamata malas, 1,0m no kontaktvada un atsaites līnijas ass uz katru pusi.
-Neveikt darbus ārpus darbu zonas.
-Būvbedrēm, kas tuvāk par 2,5m no balsta pamata paredzēt rievsienu vai analogu;
-Darbi, kas paredzēti tuvu RP SIA "Rīgas satiksme" balsta pamatam, izsaukt RP SIA "Rīgas satiksme" pārstāvi 26631222
-Nemainīt esošās vertikālā plānojuma atzīmes un nepieļaut balsta pamatu atsegšanu vai kalšanu.
-Darbu laikā nodrošināt piekļuvi RP SIA "Rīgas satiksme" elektrotransporta kontakttīklu konstrukciju apkopei un remontam.
-Avārijas gadījumā nekavējoties jānodrošina RP SIA "Rīgas satiksme" speciālistiem piekļuvi ar autotorni bojājumu vietai.
RP SIA "Rīgas Satiksme"
Mārtiņš Plataiskalns
parakstīts elektroniski
Vecākais inženierkomunikāciju piesaistes inženieris
30.10.2025.

- NODROŠINĀT PIEKĻUVI ĪPAŠUMIEM DROŠI ŠĶĒRSOJOT REMONTDARBU ZONU
- GĀJĒJU KORIDORA PLATUMS 1.5m (NOROBEŽOTS AR PALĪGBARJERĀM)
- VISAS CEĻA ZĪMES, KAS IR PRETRUNĀ AR PAGAIDU SATIKSMES ORGANIZĀCIJU TIEK AIZSEGTAS, VAI DEMONTĒTAS
- NODROŠINĀT VISA VEIDA SATIKSMI
- DARBU VIETU APRĪKOT ATBILSTOŠI MK NOTEIKUMIEM NR.421
- DARBU VIETU APRĪKOT AR VADSTATŅIEM / PALĪGBARJERĀM
- DARBU ILGUMS - 4 MĒNEŠI
- VEICAMIE DARBI - VELO INFRASTRUKTŪRAS IZBŪVE, BRAUKTUVES REMONTDARBI
- ATBILDĪGAIS PAR DARBU VIETAS APRĪKOJUMU: MAREKS KRŪMIŅŠ (BŪVDARBU VADĪTĀJS) tel.: 26266750

DARBU ZONA
PAGAIDU IETVE (1.5m PLATA)
206 ESOŠA CEĻAZĪME
118 UZSTĀDĀMA CEĻAZĪME
GĀJĒJU MARŠRUTS

Saskaņojums derīgs ar Rīgas valstspilsētas Ārtelpas un Mobilitātes Departamenta direktora rīkojumu
Shēma ir Darbu veikšanas atļaujas neatņemama sastāvdaļa
Shēma derīga ievērojot Ministru kabineta 02.10.2001. noteikumus Nr. 421
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta Satiksmes organizācijas un kustības drošības nodaļas satiksmes organizācijas speciālists
A.Šmilga
28-10-2025

BIS lietas Nr.: BIS-BL-743111-106878

SHĒMAS NR.	SATIKSMES ORGANIZĀCIJAS IZSTRĀDĀTĀJS:				PASŪTĪTĀJS:
12.	KMP SIA KMK PROJEKTS info@kmkprojekts.lv				SIA VIA tel.: 26266750 via@via.com.lv
		UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	OBJEKTS: REĢIONĀLAS UN PILSĒTAS NOZĪMES VELO INFRASTRUKTŪRAS IZVEIDE MARŠRUTĀ RĪGA - BABĪTE - PIŅĶI
RASĒJA	SIA KMK PROJEKTS	M.KRIŽEVICS			
PĀRBAUDĪJA	SIA KMK PROJEKTS	R.KASŅIKOVSKIS			
					RASĒJUMS: DARBA VIETAS APRĪKOJUMA SHĒMA REMONTDARBU LAIKĀ
